

**SECOM - Secretaría Nacional de Comunicación**  
**Subsecretaría de Medios Institucionales**  
**Dirección de Contenidos de Medios Institucionales**

**PROYECTO: K002 Canal 48-49**

|                                |   |                                 |  |
|--------------------------------|---|---------------------------------|--|
| Líder del Proyecto:            | Acaro Vega, Christian Fernando (christian.acaro@secom.gob.ec) |                                 |  |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Pacheco Vásquez, Galo Patricio                                | Programas Relacionados:         | IMPLEMENTACION DE EL CIUDADANO TV 48 Y 49 CANAL DE TELEVISION DE LA FUNCION EJECUTIVA. |
| Titular:                       | Torres Bastidas, Christian                                    | Prioridad:                      | 0  |
| Tipo de Proyecto:              | Tecnología  | Retorno Económico:              | 1.52   |
| CUP:                           | 30200000.0000.376396  | TIR:                            | 20.96 %  |
| Objetivos Operativos:          | 2   | VAN:                            | 2,035,936.33   |
| Viabilidad Técnica:            | Media   | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 4,247,822.99   |
| Localidad de Gestión:          | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3  |                                 |  |
| Tipo de Ppto. Externo:         |   | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2014 - 31/12/2015  |
| Fecha de última actualización: | 05/06/2015  | Fecha de Fin Base:              | 31/12/2015   |
| Modificado por:                | Acaro Vega, Christian Fernando                                | Fecha del siguiente Hito:       | 19/06/2015   |

Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Población de referencia: La población total de influencia del proyecto de El Ciudadano TV es todo el Ecuador, según el último censo 2010, 14.483.499 habitantes de los cuales, 7.305.816 son mujeres y 7.177.683 son hombres.  
 Población demandante potencial: Considerando que "El Ciudadano TV" cubrirá 47 coberturas a nivel nacional.

La población objetivo son los y las ciudadanas a partir de los 16 años de edad, considerando como las edades que tienen el hábito de ver al menos un programa relacionado al fomento a la participación ciudadana y que promueva la comunicación entre mandantes y mandatario.

Es necesario implementar y diseñar Ciudadano TV como una red pública de comunicación y de servicios a la ciudadanía, que fomente la participación ciudadana y que promueva la comunicación entre mandantes y mandatario. El sistema es más que un medio de comunicación, será además, una herramienta que apoye a la gobernabilidad y que informe permanentemente sobre las actividades del poder ejecutivo; promover valores ciudadanos, culturales, educativos, pero sobre todo, fomentar y fortalecer la democracia. La población total de influencia del proyecto de El Ciudadano TV es todo el Ecuador, hay que considerar que "El Ciudadano TV" cubrirá 47 coberturas a nivel nacional.

**Objetivo General**

Implementar un sistema de TV en señal abierta de la Función Ejecutiva como parte de la propuesta de comunicación gubernamental: Canal público "El Ciudadano TV".

**Objetivos Específicos**

- C1. Establecer las condiciones necesarias para una transmisión inmediata del canal público "El Ciudadano TV". Fase 1.
- C2. Operar el canal público "El Ciudadano TV" en frecuencia 48 y 49 UHF a nivel nacional con Infraestructura y equipamiento propios. Fase 2

**Beneficios Cualitativos**

Contribuir al fortalecimiento democrático del país en su perspectiva del Buen Vivir, transparentando el trabajo de la Función Ejecutiva, auspicando el debate, la educación y participación ciudadana .

Después de culminado el proyecto, se incrementará en un 10% a nivel nacional el conocimiento de la institucionalidad y actividades que lleva el gobierno en beneficio de sus mandantes.

**Tipo de Beneficiario**

Externo caracterizado por la población objetivo son los y las ciudadanas a partir de los 16 años de edad, considerando como las edades que tienen el hábito de ver al menos un programa relacionado al fomento a la participación ciudadana y que promueva la comunicación entre mandantes y mandatario.


**Restricciones**

TIEMPO: 24 MESES  
 COSTO: \$ 6.530.413,14  
 ALCANCE: NACIONAL  
 RECURSOS: TECNOLÓGICOS, MATERIALES Y HUMANO

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 71.64 %  
 Fecha de Inicio: 01/01/2014      Fecha de Fin: 31/12/2015

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

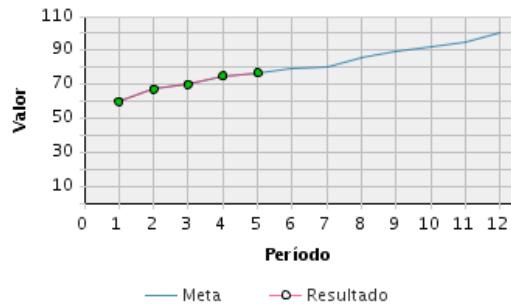

| Porcentaje de Avance |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Año                  | Ene                         | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic   |
| 2015                 | Avance programado acumulado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | 60 %                        | 67 % | 70 % | 75 % | 77 % | 79 % | 80 % | 86 % | 89 % | 92 % | 95 % | 100 % |
|                      | Avance real acumulado       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | 60 %                        | 67 % | 70 % | 75 % | 77 % |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | Estado                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | ●                           | ●    | ●    | ●    | ●    |      |      |      |      |      |      |       |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                       | Fecha de última actualización |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| MAYO 2015: A la presente fecha el canal se encuentra generando el streaming de las actividades del señor Presidente que se visualiza en las páginas web de la Presidencia y El Ciudadano. Adicionalmente se ha realizado las gestiones correspondientes a fin de que ciertos programas de interés general que son producidos en el canal Público "Ecuador Tv" sean transmitidos en nuestro canal.  | Acaro Vega,<br>Christian<br>Fernando | 05/06/2015 -<br>11:36 AM      |
| ABRIL 2015: La señal del canal ahora se encuentra disponible en nuestro canal YOUTUBE Ciudadano TV y se transmite las actividades oficiales del señor Presidente de la República, en el próximo mes se tiene planificado tener streaming 24/7/365.   | Acaro Vega,<br>Christian<br>Fernando | 04/05/2015 -<br>02:58 PM      |
| MARZO 2015: Al momento el canal cuenta con la unidad móvil para realizar las transmisiones de los eventos del señor Presidente de la República y hasta la presente fecha se han realizado alrededor de 160 transmisiones en vivo correspondiente a alrededor de 250 horas.   | Acaro Vega,<br>Christian<br>Fernando | 02/04/2015 -<br>02:20 PM      |
| ENERO 2015: Al momento el canal está incluido en el 51 % de los sistemas de audio y video por suscripción a nivel nacional y se encuentra incluido en 5 de los 6 sistemas DTH (DIRECTV, TV CABLE, UNIVISA, CLARO TV y CNT TV). La programación está siendo modificada de acuerdo a la parrilla aprobada por el señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones, a fin de cumplir con el porcentaje de producción nacional establecida en la Ley Orgánica de Comunicación.                    | Acaro Vega,<br>Christian<br>Fernando | 04/03/2015 -<br>11:00 AM      |
| FEBRERO 2015: Al momento el canal cuenta con la unidad móvil para realizar las transmisiones de los eventos del señor Presidente de la República y adicionalmente cuenta con el equipo técnico y operativo para poner en funcionamiento la misma. La programación está siendo modificada de acuerdo a la parrilla aprobada por el señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones, a fin de cumplir con el porcentaje de producción nacional establecida en la Ley Orgánica de Comunicación. |                                      |                               |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                       | Fecha de última actualización |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| <p>NOVIEMBRE: Estamos transmitiendo noticieros de carácter informativo nacional en la mañana, al medio día y en la noche que la productora local contratada nos entrega y hasta la presente fecha se han realizado alrededor de 100 transmisiones en vivo de eventos del Gobierno Nacional; adicionalmente, nos encontramos 24/7/365 en DIRECTV en el canal 177</p> <p>DECIEMBRE: Al momento el proyecto cuenta con 43 repetidoras UHF canal 48 y 49 al aire respectivamente, en 20 provincias del país y estamos incluidos en el 38 % de los sistemas de audio y video por suscripción a nivel nacional. La programación está siendo modificada de acuerdo a la parrilla aprobada por el señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones, a fin de cumplir con el porcentaje de producción nacional establecida en la Ley Orgánica de Comunicación.</p> | Acaro Vega,<br>Christian<br>Fernando | 05/01/2015 -<br>03:16 PM      |
| <p>OCTUBRE: Al momento el proyecto cuenta con 43 repetidoras UHF canal 48 y 49 al aire respectivamente, en 20 provincias del país enlazadas vía satélite dese un control master digital calidad SD que ha sido alquilado junto con estudios, cabina de locución, equipo técnico y operativo necesarios para la operación. Se cuenta también con programación de carácter informativo nacional contratada con una productora local; y, a la presente fecha estamos siendo retransmitidos por el 30% de los sistemas de audio y video por suscripción a nivel nacional.</p>  | Suárez Callejas,<br>Diego            | 06/11/2014 -<br>09:55 AM      |

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

|   | Riesgo  | Fecha de última actualización | Responsable                         | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| 1 | <b>5- PROYECTO. Tiempo.</b><br>Demora en la elaboración del contrato por parte de SECOM CAUSARIA un retraso en la autorización de las frecuencias | 31/10/2014                    | Christian<br>Fernando<br>Acaro Vega | 40 %         | 70      | 28           | 0/1                         |
| 2 | <b>5- PROYECTO. Tiempo.</b><br>Retraso en el cumplimiento del contrato CAUSARIA demora en el cumplimiento del cronograma                          | 03/12/2014                    | Christian<br>Fernando<br>Acaro Vega | 30 %         | 50      | 15           | 0/1                         |
| 3 | <b>5- PROYECTO. Tiempo.</b><br>Retraso en el cumplimiento del contrato CAUSARIA demora en el cumplimiento del cronograma                          | 31/10/2014                    | Christian<br>Fernando<br>Acaro Vega | 30 %         | 50      | 15           | 0/1                         |
| 4 | <b>5- PROYECTO. Tiempo.</b><br>Retraso en el cumplimiento del contrato CAUSARIA demora en el cumplimiento del cronograma                          | 31/10/2014                    | Christian<br>Fernando<br>Acaro Vega | 30 %         | 50      | 15           | 0/1                         |
| 5 | <b>5- PROYECTO. Tiempo.</b><br>Retraso en el cumplimiento del contrato CAUSARIA demora en el cumplimiento del cronograma                          | 02/04/2015                    | Christian<br>Fernando<br>Acaro Vega | 30 %         | 50      | 15           | 0/1                         |
| 6 | <b>5- PROYECTO. Tiempo.</b><br>Retraso en el cumplimiento del contrato CAUSARIA demora en el cumplimiento del cronograma                          | 31/10/2014                    | Christian<br>Fernando<br>Acaro Vega | 30 %         | 50      | 15           | 0/1                         |
| 7 | <b>5- PROYECTO. Tiempo.</b><br>Retraso en el cumplimiento del contrato CAUSARIA demora en el cumplimiento del cronograma                          | 31/10/2014                    | Christian<br>Fernando<br>Acaro Vega | 30 %         | 50      | 15           | 0/1                         |

Riesgos cerrados: 5

**LOCALIDADES**

|   | Localidad de Impacto   |
|---|--|
| 1 | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 |

HITOS

|    | Hito  | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo  | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| 1  | EJECUCIÓN: Solicitud firmada de convenio de pago por estudios de ingeniería de frecuencias  | 3-Adjudicación            | 14/10/2014         |                | 13/10/2014 |    | Sí            | 2.0           |
| 2  | EJECUCIÓN: Informe firmado de avance de cobertura en sistemas AVS   | 5-Entregables Intermedios | 17/10/2014         |                | 17/10/2014 |    | Sí            | 10.0          |
| 3  | EJECUCIÓN: Informe firmado de operación de repetidoras a nivel nacional.  | 5-Entregables Intermedios | 17/10/2014         |                | 17/10/2014 |    | Sí            | 15.0          |
| 4  | EJECUCIÓN: Contrato suscrito para la adquisición de programación con contenidos nacionales.   | 4-Inicio de Trabajo       | 20/10/2014         |                | 20/10/2014 |    | Sí            | 4.0           |
| 5  | EJECUCIÓN: Convenio para retransmisión con la operadora DirecTV   | 4-Inicio de Trabajo       | 17/11/2014         |                | 11/11/2014 |    | Sí            | 3.0           |
| 6  | EJECUCIÓN: Convenio de pago firmado por elaboración de estudios de ingeniería de frecuencias  | 4-Inicio de Trabajo       | 28/11/2014         |                | 18/11/2014 |    | Sí            | 2.0           |
| 7  | EJECUCIÓN: Estudio Financiero elaborado para autorización definitiva  | 5-Entregables Intermedios | 28/11/2014         |                | 28/11/2014 |    | Sí            | 3.0           |
| 8  | EJECUCIÓN: Informe firmado con TDRs para adquisición estación terrena, MAM, Control Master, Equipamiento estudios                               | 5-Entregables Intermedios | 28/11/2014         |                | 28/11/2014 |    | Sí            | 2.0           |
| 9  | EJECUCIÓN: Adendum a convenio con ECTV firmado para instalación de 5 repetidoras adicionales  | 4-Inicio de Trabajo       | 15/12/2014         |                | 15/12/2014 |  | Sí            | 2.0           |
| 10 | EJECUCIÓN: Informe firmado de requerimiento de espacio físico para instalación de estudios, control master, control técnico y estación terrena. | 5-Entregables Intermedios | 15/12/2014         |                | 15/12/2014 |  | Sí            | 2.0           |
| 11 | EJECUCIÓN: Informe firmado de avance de instalación de las 5 repetidoras y cobertura sistemas AVS   | 5-Entregables Intermedios | 19/12/2014         |                | 19/12/2014 |  | Sí            | 3.0           |
| 12 | EJECUCIÓN: Informe firmado de requerimiento de alquiler del control master para el año 2015   | 5-Entregables Intermedios | 19/12/2014         |                | 19/12/2014 |  | Sí            | 2.0           |
| 13 | EJECUCIÓN: Plan Comunicacional elaborado para la autorización definitiva de frecuencias   | 5-Entregables Intermedios | 23/12/2014         |                | 23/12/2014 |  | Sí            | 3.0           |
| 14 | EJECUCIÓN: Solicitud de autorización de frecuencias definitiva ingresada a la autoridad de telecomunicaciones                                   | 9-Entregables Formales    | 09/01/2015         |                | 09/01/2015 |  | Sí            | 4.0           |
| 15 | EJECUCIÓN: Informe firmado de requerimiento de transferencia de fondos por convenio ECTV para el año 2015.                                      | 4-Inicio de Trabajo       | 09/01/2015         |                | 09/01/2015 |  | Sí            | 2.0           |

HITOS

|    | Hito   | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 16 | EJECUCIÓN: Informe firmado con TDRs para consultoría de diseño físico y arquitectónico de estudios.  | 5-Entregables Intermedios              | 16/01/2015         |                | 16/01/2015 |          | Sí            | 1.0           |
| 17 | EJECUCIÓN: Informe firmado con TDRs para consultoría de diseño físico y arquitectónico de estudios   | 5-Entregables Intermedios              | 16/02/2015         |                | 16/02/2015 |          | Sí            | 1.0           |
| 18 | EJECUCIÓN: Informe final firmado de instalación de 5 repetidoras   | 9-Entregables Formales                 | 20/02/2015         |                | 20/02/2015 |          | Sí            | 3.0           |
| 19 | EJECUCIÓN: Contrato firmado de alquiler del control Master   | 4-Inicio de Trabajo                    | 27/02/2015         |                | 27/02/2015 |          | Sí            | 3.0           |
| 20 | EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción firmada, de consultoría para diseño físico y arquitectónico de estudios.                              | 5-Entregables Intermedios              | 30/03/2015         |                | 30/03/2015 |          | Sí            | 2.0           |
| 21 | EJECUCIÓN: Informe firmado de avance de obtención de frecuencias definitivas para El ciudadano TV  | 5-Entregables Intermedios              | 30/03/2015         |                | 30/03/2015 |          | Sí            | 1.0           |
| 22 | EJECUCIÓN: Informe firmado con TDRs para adecuación de espacios físicos y arquitectónicos.   | 5-Entregables Intermedios              | 10/04/2015         |                | 10/04/2015 |          | Sí            | 1.0           |
| 23 | EJECUCIÓN: Resolución de autorización definitiva de frecuencias emitida por la autoridad de telecomunicaciones                             | 9-Entregables Formales                 | 30/04/2015         |                | 30/04/2015 |          | Sí            | 4.0           |
| 24 | EJECUCIÓN: Informe firmado de avance de los procesos de adquisición del equipamiento para estudios, control master, estación terrena y MAM | 5-Entregables Intermedios              | 29/05/2015         |                | 29/05/2015 |          | Sí            | 1.0           |
| 25 | EJECUCIÓN: Informe firmado de avance del proceso de contratación de adecuaciones físicas y arquitectónicas de los estudios                 | 5-Entregables Intermedios              | 29/05/2015         |                | 29/05/2015 |          | Sí            | 1.0           |
| 26 | EJECUCIÓN: Informe firmado con TDRs para adquisición de sistemas de transmisión para TDT   | 5-Entregables Intermedios              | 19/06/2015         | 19/06/2015     |            |          | No            | 1.0           |
| 27 | EJECUCIÓN: Solicitud ingresada de autorización de frecuencias para TDT en el organismo regulador   | 9-Entregables Formales                 | 26/06/2015         | 26/06/2015     |            |          | No            | 1.0           |
| 28 | EJECUCIÓN: Informe firmado de avance de solicitud de frecuencias para TDT  | 5-Entregables Intermedios              | 30/07/2015         | 30/07/2015     |            |          | No            | 1.0           |
| 29 | EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción firmada de adecuaciones físicas y arquitectónicas de los estudios de El Ciudadano TV                  | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 21/08/2015         | 21/08/2015     |            |          | No            | 3.0           |
| 30 | EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción firmada de la estación terrena  | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 28/08/2015         | 28/08/2015     |            |          | No            | 3.0           |

### HITOS

|    | Hito   | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 31 | EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción firmada del control master y control técnico  | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 25/09/2015         | 25/09/2015     |            |          | No            | 3.0           |
| 32 | EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción firmada del sistema MAM                       | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 23/10/2015         | 23/10/2015     |            |          | No            | 3.0           |
| 33 | EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción firmada del equipamiento de estudio           | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 27/11/2015         | 27/11/2015     |            |          | No            | 3.0           |
| 34 | EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción firmada del alquiler del control master       | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 11/12/2015         | 11/12/2015     |            |          | No            | 3.0           |
| 35 | CIERRE: Informes final firmado de la implementación del proyecto "El Ciudadano TV" | V - Verificación ejecutiva             | 29/12/2015         | 29/12/2015     |            |          | No            | 2.0           |

### INDICADORES DEL PROYECTO

|   | Indicador  | Estado | Avance al Período | Meta  | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|--|--------|-------------------|-------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Número de estudios de canal "El Ciudadano TV" equipados y funcionando                  |        | -                 | -     | -                     | 01/01/2015      | -                          |
| 2 | Número de repetidoras transmitiendo la señal "El Ciudadano TV"                         |        | 97.73 %           | 44    | 43                    | 01/10/2014      | Ene-Abr                    |
| 3 | Porcentaje de cobertura de la señal de TV en el territorio Ecuatoriano (24 Provincias) |        | 95.23 %           | 0.875 | 0.8333                | 01/10/2014      | Ene-Abr                    |


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Anticipo Desembolsado:        | 925,587.20      |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 4,247,822.99 ** |
| Costo Total:                  | 6,530,413.14    |
| Total Devengado:              | 2,084,198.18    |
| % Costo Total Devengado:      | 31.92 %         |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**




% Costo Total Devengado: 31.92 %

**Perfil Económico 2015**

|   | Años Previos        | Año Actual (2015)   | Años Futuros | Total               |
|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Ppto. Planeado  | 1,640,889.17        | 3,040,000.00        | 0.00         | <b>4,680,889.17</b> |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 0.00                | 0.00                | 0.00         | <b>0.00</b>         |
| <b>Ppto. Aprobado Inicial</b>                           | <b>1,190,000.00</b> | <b>3,040,000.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>4,230,000.00</b> |
| Ppto. Codificado  | 1,292,039.28        | 3,230,400.00        | 0.00         | <b>4,522,439.28</b> |
| Ppto. Comprometido                                      | 1,250,767.43        | 876,380.19          | 0.00         | <b>2,127,147.62</b> |
| Planeado - Codificado (2015)                            |                     | -190,400.00         |              |                     |
| <b>Programado a Devengar</b>                            | <b>1,640,889.17</b> | <b>3,040,000.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>4,680,889.17</b> |
| Ppto. Devengado   | 1,207,822.99        | 876,375.19          | 0.00         | <b>2,084,198.18</b> |
| Estimado a fin de año                                   | * 1,207,822.99      | 3,040,000.00        | 0.00         | <b>4,247,822.99</b> |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 433,066.18          | 0.00                | 0.00         | <b>433,066.18</b>   |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 73.61 %           | 28.83 %             | 0.00 %       | <b>44.53 %</b>      |
| <b>Ppto. Codificado 998</b>                             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>         |
| <b>Ppto. Devengado 998</b>                              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>         |

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015**

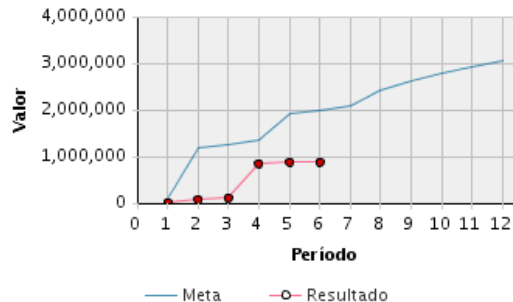

**Presupuesto Mensual 2015**

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 72,677.34                  | 14,562.62           | 72,677.34                    | 14,562.62             | 20.04 %          |        | 0.48 %       |

| Presupuesto Mensual 2015 |                            |                     |                              |                       |                  |        |              |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes                      | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb                      | 1,106,135.52               | 66,057.10           | 1,178,812.86                 | 80,619.72             | 6.84 %           |        | 2.65 %       |
| Mar                      | 79,635.52                  | 23,463.57           | 1,258,448.38                 | 104,083.29            | 8.27 %           |        | 3.42 %       |
| Abr                      | 88,635.52                  | 739,875.08          | 1,347,083.90                 | 843,958.37            | 62.65 %          |        | 27.76 %      |
| May                      | 561,179.39                 | 31,517.32           | 1,908,263.29                 | 875,475.69            | 45.88 %          |        | 28.80 %      |
| Jun                      | 79,635.52                  | 899.50              | 1,987,898.81                 | 876,375.19            | 44.09 %          |        | 28.83 %      |
| Jul                      | 79,635.52                  |                     | 2,067,534.33                 |                       |                  |        |              |
| Ago                      | 363,789.59                 |                     | 2,431,323.92                 |                       |                  |        |              |
| Sep                      | 169,725.52                 |                     | 2,601,049.44                 |                       |                  |        |              |
| Oct                      | 174,635.52                 |                     | 2,775,684.96                 |                       |                  |        |              |
| Nov                      | 129,635.52                 |                     | 2,905,320.48                 |                       |                  |        |              |
| Dic                      | 134,679.52                 |                     | 3,040,000.00                 |                       |                  |        |              |
| <b>Total</b>             | <b>3,040,000.00</b>        | <b>876,375.19</b>   |                              |                       |                  |        |              |

### OBJETIVOS ALINEADOS

#### Objetivos Operativos

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Aumentar el volumen en la producción periodística en las plataformas del SIO "El Ciudadano" MEDIANTE el fortalecimiento de las coberturas de temas de interés ciudadano, que estén en el centro del debate público. |
|---|---|

#### Objetivos Operativos Matriciales

SECOM - Secretaría Nacional de Comunicación >Subsecretaría de Medios Institucionales >Dirección de Informes Gubernamentales

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Incrementar la calidad de la producción y los contenidos de los informes gubernamentales MEDIANTE el fortalecimiento de los procesos de producción y difusión, incorporación de contenidos de interés ciudadano, la adquisición de equipos de última tecnología, la capacitación técnica del personal y la implementación del Canal 48. |
|---|---|

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo   | Archivo   | Fecha de Alta |
|----|--|---|---------------|
| 1  | Cedula presupuestaria Diciembre 2014   | Cedula_presupuestaria_Diciembre_2014.pdf                      | 05/01/2015    |
| 2  | Cedula presupuestaria Febrero 2015   | Cedula_presupuestaria_Febrero_de_2015.pdf                     | 04/03/2015    |
| 3  | Cedula presupuestaria noviembre  | Cedula_Presupuestaria_Noviembre.pdf                           | 03/12/2014    |
| 4  | Hito - 14 Solicitud de autorización de frecuencias definitiva ingresada a la autoridad de telecomunicaciones                                   | Solicitud__Sostenibilidad_Económica_y_Plan_Comunicacional.pdf | 04/02/2015    |
| 5  | Hito - 14.1 Solicitud de autorización de frecuencias definitiva ingresada a la autoridad de telecomunicaciones                                 | Estudio_de_ingenieria.pdf                                     | 04/02/2015    |
| 6  | Hito - 15 Informe firmado de requerimiento de transferencia de fondos por convenio ECTV para el año 2015.                                      | INFORME_NO_04-2015_Informe_de_convenio_ECTV.pdf               | 04/02/2015    |
| 7  | Hito - 16 Informe firmado con TDRs para consultoría de diseño físico y arquitectónico de estudios.   | TDR_consultoria_arquitectonica_CTV_final.pdf                  | 04/02/2015    |
| 8  | HITO 10 - Informe firmado de requerimiento de espacio físico para instalación de estudios, control master, control técnico y estación terrena. | Requerimiento_de_espacios_fisicos_CTV.pdf                     | 05/01/2015    |
| 9  | Hito 11 - Informe firmado de avance de instalación de las 5 repetidoras y cobertura sistemas AVS   | Informe_Cobertura_y_Cables_Diciembre_2014.pdf                 | 05/01/2015    |
| 10 | Hito 11.1 - Informe firmado de avance de instalación de las 5 repetidoras y cobertura sistemas AVS   | Informe_de_avance_de_instalación_de_las_5_repetidoras.pdf     | 05/06/2015    |
| 11 | HITO 12 - Informe firmado de requerimiento de alquiler del control master para el año 2015   | Requerimiento_alquiler_de_control_máster_2015.pdf             | 05/01/2015    |
| 12 | HITO 13 - Plan Comunicacional elaborado para la autorización definitiva de frecuencias   | PLAN_COMUNICACIONAL_05-01-2015.pdf                            | 05/01/2015    |



**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|    | Descripción de Archivo  | Archivo  | Fecha de Alta |
|----|---|--|---------------|
| 13 | Hito 17 Informe firmado con TDRs para consultoría de diseño físico y arquitectónico de estudios   | TDR_consultoria_arquitectónica_CTV_final.pdf               | 04/03/2015    |
| 14 | Hito 18 - Informe final firmado de instalación de 5 repetidoras   | INFORME_No_2015-02_Instalación_5_repetidoras.pdf           | 04/03/2015    |
| 15 | Hito 19 Contrato firmado de alquiler del control Master   | INFORME_No_2015-03_Status_alquiler_CABLEVISION.pdf         | 04/03/2015    |
| 16 | Hito 2 - Hito 3. Informe firmado de operación de repetidoras y sistemas de AVS a nivel nacional   | Informe_cobertura_señal_abierta_y_SAVS.pdf                 | 04/11/2014    |
| 17 | Hito 20 - Acta de entrega recepción firmada, de consultoría para diseño físico y arquitectónico de estudios.                            | INFORME_No_2015-04_Inforfme_Actas_Consultoria_diseños      | 04/04/2015    |
| 18 | Hito 21 - Informe firmado de avance de obtención de frecuencias definitivas para El ciudadano TV  | INFORME_No_2015-05_Estado_de_solicitud_definitiva_de_frec  | 02/04/2015    |
| 19 | HITO 22 - Informe firmado con TDRs para adecuación de espacios físicos y arquitectónicos.   | INFORME_No_2015-05_Inforfme_TDRs_para_las_adeacuaciones    | 04/05/2015    |
| 20 | Hito 23 - Resolución de autorización definitiva de frecuencias emitida por la autoridad de telecomunicaciones                           | INFORME_No_2015-07_Informe_de_autorización_de_frecuen      | 04/05/2015    |
| 21 | HITO 24 Informe firmado de avance de los procesos de adquisición del equipamiento para estudios, control master, estación terrena y MAM | INFORME_No_2015-08_InforfmePROCESOS_ADQUISICIÓN            | 03/06/2015    |
| 22 | HITO 25 - Informe firmado de avance del proceso de contratación de adecuaciones físicas y arquitectónicas de los estudios               | INFORME_No_2015-09_Informe_de_avance_del_proceso_de        | 03/06/2015    |
| 23 | Hito 4. Contrato suscrito para la adquisición de programación con contenidos nacionales   | Contrato_de_Programación.pdf                               | 04/11/2014    |
| 24 | HITO 4.1 - Contrato de adquisición de programación con contenidos nacionales  | Contrato_de_adquisición_de_programación_con_contenidos     | 05/06/2015    |
| 25 | Hito 5 - Convenio para retransmisión con la operadora DirecTV   | Convenio_para_retransmisión_con_la_operadora_DirecTV.pdf   | 03/12/2014    |
| 26 | Hito 6 - (1) Convenio de pago firmado por elaboración de estudios de ingeniería de frecuencias  | Convenio_de_pago_firmado_por_elaboración_de_estudios       | 03/12/2014    |
| 27 | Hito 6 - (2) Convenio de pago firmado por elaboración de estudios de ingeniería de frecuencias  | Cur_de_pago_del_convenio_firmado_por_elaboración_de_ests   | 03/12/2014    |
| 28 | Hito 7 - Estudio Financiero elaborado para autorización definitiva  | Formulario-Sostenibilidad-Economica-Publico.xls            | 03/12/2014    |
| 29 | Hito 8 - Informe firmado con TDRs para adquisición estación terrena, MAM, Control Master, Equipamiento estudios                         | Informe_firmado_con_TDRs_para_adquisición_estación_terrena | 03/12/2014    |
| 30 | Hito 9 - Adendum a convenio con ECTV firmado para instalación de 5 repetidoras adicionales  | Adendum_a_convenio_con_ECTV_firmado_para_instalación       | 05/05/2015    |
| 31 | Hito-1. Solicitud firmada de convenio de pago por estudios de ingeniería de frecuencias   | Solicitud_de_convenio_de_pago_estudio_de_ingenieria.pdf    | 04/11/2014    |
