

**SECOM - Secretaría Nacional de Comunicación**  
**Subsecretaría de Medios Institucionales**  
**Dirección de Contenidos de Medios Institucionales**

**PROYECTO: K002 Canal 48-49**

|                                |  |                                 |   |
|--------------------------------|--|---------------------------------|---|
| Líder del Proyecto:            | Arboleda Palma, Jorge Ricardo (jorge.arboleda@secom.gob.ec)  |                                 |   |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Arboleda Palma, Jorge Ricardo                                | Programas Relacionados:         | IMPLEMENTACIÓN DE EL CIUDADANO TV 48 Y 49 CANAL DE TELEVISIÓN DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA |
| Titular:                       | Novoa Oquendo, Christian Geovanny                            | Prioridad:                      | 0   |
| Tipo de Proyecto:              | Tecnología   | Retorno Económico:              | 1.38  |
| CUP:                           | 30200000.0000.376396   | TIR:                            | 103.00 %  |
| Objetivos Operativos:          | 1  | VAN:                            | 3,066,122.23  |
| Viabilidad Técnica:            | Media  | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 6,725,587.78  |
| Localidad de Gestión:          | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 |                                 |   |
| Tipo de Ppto. Externo:         |  | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2014 - 31/12/2018   |
| Fecha de última actualización: | 03/10/2018   | Fecha de Fin Base:              | 31/12/2015  |
| Modificado por:                | Arboleda Palma, Jorge Ricardo                                | Fecha del siguiente Hito:       | 31/10/2018  |

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Población de referencia: La población total de influencia del proyecto de EI CIUDADANO TV es todo el Ecuador, según el último censo 2010, 14.483.499 habitantes de los cuales, 7.305.816 son mujeres y 7.177.683 son hombres.  
 Población demandante potencial: Considerando que "EI CIUDADANO TV" cubrirá 47 coberturas a nivel nacional.

La población objetivo son los y las ciudadanas a partir de los 16 años de edad, considerando como las edades que tienen el hábito de ver al menos un programa relacionado al fomento a la participación ciudadana y que promueva la comunicación entre mandantes y mandatario.

Es necesario implementar y diseñar Ciudadano TV como una red pública de comunicación y de servicios a la ciudadanía, que fomente la participación ciudadana y que promueva la comunicación entre mandantes y mandatario. El sistema es más que un medio de comunicación, será además, una herramienta que apoye a la gobernabilidad y que informe permanentemente sobre las actividades del poder ejecutivo; promover valores ciudadanos, culturales, educativos, pero sobre todo, fomentar y fortalecer la democracia. La población total de influencia del proyecto de EI CIUDADANO TV es todo el Ecuador, hay que considerar que "EI CIUDADANO TV" cubrirá 47 coberturas a nivel nacional.

**Objetivo General**

Implementar un sistema de TV en señal abierta de la Función Ejecutiva como parte de la propuesta de comunicación gubernamental: Canal público "El Ciudadano TV".

**Objetivos Específicos**

- C1. Establecer las condiciones necesarias para una transmisión inmediata del canal público "El Ciudadano TV". Fase 1.
- C2. Operar el canal público "El Ciudadano TV" en frecuencia 48 y 49 UHF a nivel nacional con Infraestructura y equipamiento propios. Fase 2

**Beneficios Cualitativos**

Contribuir al fortalecimiento democrático del país en su perspectiva del Buen Vivir, transparentando el trabajo de la Función Ejecutiva, auspiciando el debate, la educación y participación ciudadana .

Después de culminado el proyecto, se incrementará en un 10% a nivel nacional el conocimiento de la institucionalidad y actividades que lleva el gobierno en beneficio de sus mandantes.

**Tipo de Beneficiario**

Externo caracterizado por la población objetivo son los y las ciudadanas a partir de los 16 años de edad, considerando como las edades que tienen el hábito de ver al menos un programa relacionado al fomento a la participación ciudadana y que promueva la comunicación entre mandantes y mandatario.


**Restricciones**

TIEMPO: 24 MESES  
 COSTO: \$ 6.530.413,14  
 ALCANCE: NACIONAL  
 RECURSOS: TECNOLÓGICOS, MATERIALES Y HUMANO

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 95.07 %  
 Fecha de Inicio: 01/01/2014 Fecha de Fin: 31/12/2018

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

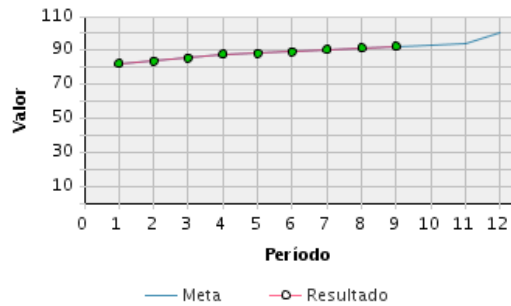

| Porcentaje de Avance |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Año                  | Ene                         | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic   |
| 2018                 | Avance programado acumulado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | 82 %                        | 84 % | 85 % | 88 % | 88 % | 89 % | 91 % | 92 % | 93 % | 93 % | 94 % | 100 % |
|                      | Avance real acumulado       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | 82 %                        | 84 % | 85 % | 88 % | 88 % | 89 % | 91 % | 92 % | 93 % |      |      |       |
| Estado               |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | ●                           | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |      |      |       |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                | Fecha de última actualización |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <p>Septiembre 2018:</p> <p>En cumplimiento de los objetivos institucionales tanto del Proyecto Implementación de El Ciudadano TV 48,49, canal de televisión de la Función Ejecutiva, durante este mes se cumplieron las actividades regulares que a nivel informativo corresponden a estos medios públicos oficiales.</p> <p>Como está establecido en la estructura vigente de estos medios, la mayor parte de los esfuerzos se destina a cumplir con labores informativas, a través de diferentes espacios diseñados para este objetivo. Las transmisiones de las actividades del Señor Presidente de la República del Ecuador, de la Señora Vicepresidenta y de otros altos dignatarios del Gobierno son un producto recurrente de nuestros medios de comunicación que presta un servicio que aprovechan, sobre todo y con mayor realce, los medios de comunicación con menos recursos que se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional. Es así, que cumplimos con la labor de difundir el trabajo de los estamentos de la Función Ejecutiva que por mandato institucional nos corresponde.</p> | Arboleda Palma, Jorge Ricardo | 03/10/2018 - 04:58 PM         |
| <p>Agosto 2018:</p> <p>En cumplimiento de los objetivos institucionales tanto del Proyecto Implementación de El Ciudadano TV 48,49, canal de televisión de la Función Ejecutiva, durante este mes se cumplieron las actividades regulares que a nivel informativo corresponden a estos medios públicos oficiales.</p> <p>Como está establecido en la estructura vigente de estos medios, la mayor parte de los esfuerzos se destina a cumplir con labores informativas, a través de diferentes espacios diseñados para este objetivo. Las transmisiones de las actividades del Señor Presidente de la República del Ecuador, de la Señora Vicepresidenta y de otros altos dignatarios del Gobierno son un producto recurrente de nuestros medios de comunicación que presta un servicio que aprovechan, sobre</p>   | Arboleda Palma, Jorge Ricardo | 06/09/2018 - 11:02 AM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                                 | Fecha de última actualización    |
|--|--|----------------------------------|
| <p>todo y con mayor realce, los medios de comunicación con menos recursos que se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional. Es así, que cumplimos con la labor de difundir el trabajo de los estamentos de la Función Ejecutiva que por mandato institucional nos corresponde.</p> <p>Se realizaron las siguientes transmisiones en vivo realizadas por el personal de la unidad móvil y streaming en el mes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inauguración de la exposición "Artesano - Artista: Tradición y creación"</li> <li>2. Rueda de prensa tras la reunión del Señor Presidente con los representantes del BID</li> <li>3. Salida del Presidente de la República a Bogotá desde el Aeropuerto Mariscal Sucre</li> <li>4. Llegada y palabras del Presidente de la República del Ecuador, a su arribo a Bogotá, Colombia.</li> <li>5. Ceremonia Militar en conmemoración de los 209 años del Primer Grito de Independencia</li> <li>6. Entrega oficial del Premio Nacional Eugenio Espejo, en conmemoración del Día Nacional de la Cultura</li> <li>7. Rueda de Prensa del MTOP sobre las disposiciones del Presidente de la República en relación al accidente de tránsito ocurrido en horas de la madrugada</li> <li>8. Entrega de resultados del examen nacional de evaluación Ser Bachiller</li> <li>9. Ceremonia de Entrega de la fase Jacinta Sandíford del Parque Samanes</li> <li>10. Rueda de prensa sobre las decisiones económicas adoptadas por el Gobierno Nacional</li> <li>11. Participación del Primer Mandatario en el evento de fortalecimiento del proyecto "Pacto por el Empleo Juvenil".</li> <li>12. Rueda de prensa sobre la situación de los ciudadanos venezolanos en el Ecuador</li> <li>13. Encuentro por los 50 años del Seguro Social Campesino</li> <li>14. Inauguración de la XXIV Feria Internacional Quito Construcción 2018</li> <li>15. Firma del Acuerdo Ministerial que asegura el pago por compensación jubilar al sector público</li> <li>16. Promoción de estudiantes de la Fase 1, campaña Todos ABC Monseñor Leonidas Proaño</li> </ol> <p>Adicionalmente, la unidad móvil, de acuerdo a las necesidades institucionales, realizó dos grabaciones en exteriores solicitadas por el área de producción de acuerdo al siguiente detalle:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reunión con migrantes venezolanos.</li> <li>2. Grabación de entrevistas a migrantes venezolanos.</li> </ol> |  |                                  |
| <p>Julio 2018:</p> <p>En cumplimiento de los objetivos institucionales tanto del Proyecto Implementación de El Ciudadano TV 48,49, canal de televisión de la Función Ejecutiva, durante este mes se cumplieron las actividades regulares que a nivel informativo corresponden a estos medios públicos oficiales.</p> <p>Como está establecido en la estructura vigente de estos medios, la mayor parte de los esfuerzos se destina a cumplir con labores informativas, a través de diferentes espacios diseñados para este objetivo. Las transmisiones de las actividades del Señor Presidente de la República del Ecuador, de la Señora Vicepresidenta y de otros altos dignatarios del Gobierno son un producto recurrente de nuestros medios de comunicación que presta un servicio que aprovechan, sobre todo y con mayor realce, los medios de comunicación con menos recursos que se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional. Es así, que cumplimos con la labor de difundir el trabajo de los estamentos de la Función Ejecutiva que por mandato institucional nos corresponde.</p> <p>Se realizaron las siguientes transmisiones en vivo realizadas por el personal de la unidad móvil y streaming en el mes de julio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sesión solemne por el 51 aniversario de la cantonización Santo Domingo.</li> <li>2. Firma del Decreto para la creación de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe.</li> <li>3. Encuentro Ciudadano con las brigadistas de la Misión Manuela Espejo.</li> <li>4. Rueda de Prensa desde SECOM sobre las estadísticas de desempleo y pobreza en el Ecuador.</li> <li>5. Foro construyendo igualdad desde la Universidad Simón Bolívar Quito.</li> <li>6. Rueda de Prensa de la Señora Ministra de Justicia, Secretario de Comunicación y Representantes de CIDH.</li> <li>7. Feria de presentación del programa "Impulso Joven".</li> </ol> <p>Adicionalmente, la unidad móvil, de acuerdo a las necesidades institucionales, realizó dos grabaciones en exteriores solicitadas por el área de producción de acuerdo al siguiente detalle:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Grabación de programa Dialogamos con Lenin en el Instituto Tecnológico Tsáchila</li> <li>2. Minga Agropecuaria, entrega de títulos y créditos productivos.</li> </ol>   | <p>Arboleda Palma,<br/>Jorge Ricardo</p>       | <p>06/08/2018 -<br/>07:01 PM</p> |
| <p>1.ANTECEDENTES</p> <p>De acuerdo a las necesidades de la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM), la Subsecretaría de Medios Institucionales realiza transmisiones en vivo de la agenda de actividades de la Función Ejecutiva, así como de eventos de interés nacional, en este contexto se</p>  | <p>Vallejo Villacres,<br/>Elizabeth Andrea</p> | <p>04/07/2018 -<br/>09:35 AM</p> |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por   | Fecha de última actualización    |       |                        |         |  |            |  |                     |              |                          |  |             |  |                     |              |                          |  |  |  |
|---|--|----------------------------------|-------|------------------------|---------|--|------------|--|---------------------|--------------|--------------------------|--|-------------|--|---------------------|--------------|--------------------------|--|--|--|
| <p>traslada personal técnico y periodístico hacia los diferentes sitios donde se requiera realizar las transmisiones.</p> <p>La realización de una transmisión en vivo es dispuesta por las autoridades de la SECOM. Una vez que se cuenta con la disposición de una transmisión, se trabaja coordinadamente con diferentes áreas de la institución a fin de llevar a cabo las tareas requeridas.</p> <p>La señal generada en exteriores se recibe en los estudios para posteriormente ser emitida al aire a través de las estaciones transmisoras y las diferentes plataformas digitales (streaming, página web, app).</p> <p><b>2.CONTENIDO/ANÁLISIS TÉCNICO</b></p> <p>Con el fin de que la ciudadanía conozca de primera mano y de manera oportuna acerca de las acciones y gestiones emprendidas por el Gobierno Nacional en favor de los mandantes, en el mes de junio de 2018 se han realizado seis transmisiones en vivo, cuatro de éstas corresponden a eventos donde ha intervenido el Señor Presidente de la República y eventos de interés nacional organizados por estamentos de la Función Ejecutiva.</p> <p>En la siguiente tabla se refleja el detalle de las transmisiones realizadas en junio a través de la Unidad Móvil:</p> <table border="0"> <tr> <td>No.Fecha</td> <td>Evento</td> <td>Medio</td> </tr> <tr> <td>Responsible del Evento</td> <td>Técnico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>17-June-18</td> <td>Grabación de programa: Dialogamos con Lenín en el Parque Cumandá</td> <td>PRESIDENCIA - SECOM</td> </tr> <tr> <td>Nelson López</td> <td>Unidad Móvil - Grabación</td> <td></td> </tr> <tr> <td>212-June-18</td> <td>Grabación de programa: Dialogamos con Lenín en la UEM del Tena</td> <td>PRESIDENCIA - SECOM</td> </tr> <tr> <td>Nelson López</td> <td>Unidad Móvil - Grabación</td> <td></td> </tr> </table>   | No.Fecha   | Evento                           | Medio | Responsible del Evento | Técnico |  | 17-June-18 | Grabación de programa: Dialogamos con Lenín en el Parque Cumandá | PRESIDENCIA - SECOM | Nelson López | Unidad Móvil - Grabación |  | 212-June-18 | Grabación de programa: Dialogamos con Lenín en la UEM del Tena | PRESIDENCIA - SECOM | Nelson López | Unidad Móvil - Grabación |  |  |  |
| No.Fecha  | Evento   | Medio                            |       |                        |         |  |            |  |                     |              |                          |  |             |  |                     |              |                          |  |  |  |
| Responsible del Evento  | Técnico  |                                  |       |                        |         |  |            |  |                     |              |                          |  |             |  |                     |              |                          |  |  |  |
| 17-June-18  | Grabación de programa: Dialogamos con Lenín en el Parque Cumandá | PRESIDENCIA - SECOM              |       |                        |         |  |            |  |                     |              |                          |  |             |  |                     |              |                          |  |  |  |
| Nelson López  | Unidad Móvil - Grabación   |                                  |       |                        |         |  |            |  |                     |              |                          |  |             |  |                     |              |                          |  |  |  |
| 212-June-18   | Grabación de programa: Dialogamos con Lenín en la UEM del Tena   | PRESIDENCIA - SECOM              |       |                        |         |  |            |  |                     |              |                          |  |             |  |                     |              |                          |  |  |  |
| Nelson López  | Unidad Móvil - Grabación   |                                  |       |                        |         |  |            |  |                     |              |                          |  |             |  |                     |              |                          |  |  |  |
| <p>Mayo 2018:</p> <p>En cumplimiento de los objetivos institucionales tanto del Proyecto Implementación de El Ciudadano TV 48,49, canal de televisión de la Función Ejecutiva, durante el mes de mayo del presente año se cumplieron las actividades regulares que a nivel informativo corresponden a estos medios públicos oficiales.</p> <p>Como está establecido en la estructura vigente de estos medios, la mayor parte de los esfuerzos se destina a cumplir con labores informativas, a través de diferentes espacios diseñados para este objetivo. Las transmisiones de las actividades del Señor Presidente de la República del Ecuador, de la Señora Vicepresidenta y de otros altos dignatarios del Gobierno son un producto recurrente de nuestros medios de comunicación que presta un servicio que aprovechan, sobre todo y con mayor realce, los medios de comunicación con menos recursos que se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional. Es así, que cumplimos con la labor de difundir el trabajo de los estamentos de la Función Ejecutiva que por mandato institucional nos corresponde.</p> <p>En mayo el área técnica operativa ha realizado, además de las funciones propias que permiten garantizar la operatividad de los medios de comunicación, los procesos faltantes de registro público de medios y rendición de cuentas antes el CORDICOM, dando cumplimiento a la normativa regulatoria vigente.</p> <p>Otras actividades administrativas desarrolladas son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.Se solicitó cotizaciones para valorar posibilidades de traslado y/o funcionamiento de equipos de control master que permita emitir la señal 24/7 de El Ciudadano TV.</li> <li>.Se desarrollaron actividades de elaboración de informes para avanzar con el proceso de mantenimiento de la unidad móvil.</li> <li>.Se coordinó y realizó el mantenimiento de los equipos de transmisión portátil livestreaming.</li> <li>.Se desarrolló una alternativa de utilización del equipo de emisión de señal sin costo para la SECOM a fin de emitir la señal de El Ciudadano Tv desde sus propias oficinas.</li> </ul> <p>En el Ciudadano Tv se realizaron las siguientes transmisiones de la Función Ejecutiva:</p> <p>Posesión de nuevos ministros<br/>Informe a la Nación Primer año de Gobierno</p> <p>Tipo de TransmisiónNúmero<br/>Unidad móvil2<br/>Equipo streaming0</p> | <p>Vallejo Villacres,<br/>Elizabeth Andrea</p>                   | <p>04/07/2018 -<br/>09:11 AM</p> |       |                        |         |  |            |  |                     |              |                          |  |             |  |                     |              |                          |  |  |  |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                         | Fecha de última actualización    |
|--|--|----------------------------------|
| <p>TOTAL2</p> <p>Informe de Gestión del Proyecto de Rehabilitación Radio Ciudadana y del Proyecto Implementación de El Ciudadano TV 48,49, canal de televisión de la Función Ejecutiva</p> <p>ABRIL DEL 2018</p> <p>Como está establecido en la estructura vigente de estos medios, la mayor parte de los esfuerzos se destina a cumplir con labores informativas, a través de diferentes espacios diseñados para este objetivo. Las transmisiones de las actividades del Señor Presidente de la República del Ecuador, de la Señora Vicepresidenta y de otros altos dignatarios del Gobierno son un producto recurrente de nuestros medios de comunicación que presta un servicio que aprovechan, sobre todo y con mayor realce, los medios de comunicación con menos recursos que se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional. Es así, que cumplimos con la labor de difundir el trabajo de los estamentos de la Función Ejecutiva que por mandato institucional nos corresponde.</p> <p>Durante abril se realizaron 8 transmisiones por El Ciudadano Tv, 12 por radio La Ciudadana, 20 productos gráficos, 86 programas radiales, 368 fotografías, 20 galería fotográficas, 4 El Presidente Informa, 112 productos audiovisuales (insumos para la cadena nacional), 58 coberturas de las actividades del Presidente de la República y de interés presidencial, 9 producciones gráficas para la cadena, 9 vídeos para otras instituciones públicas, 5 cuñas radiales para otras instituciones públicas, 5 locuciones para la Vicepresidencia de la República, 32 infochannels, 814 micro informativos, 3 coberturas y 4 transmisiones a través de nuestros medios.</p>  | <p>Khalife Moraga,<br/>Galo Miguel</p> | <p>07/05/2018 -<br/>08:52 AM</p> |
| <p>Enero-Marzo 2018</p> <p>RESUMEN EJECUTIVO</p> <p>Informe de Gestión del Proyecto de Rehabilitación Radio Ciudadana y del Proyecto Implementación de El Ciudadano TV 48,49, canal de televisión de la Función Ejecutiva ENERO DE 2018</p> <p>Como está establecido en la estructura vigente de estos medios, la mayor parte de los esfuerzos se destina a cumplir con labores informativas, a través de diferentes espacios diseñados para este objetivo. Las transmisiones de las actividades del Señor Presidente de la República del Ecuador, de la Señora Vicepresidenta y de otros altos dignatarios del Gobierno son un producto recurrente de nuestros medios de comunicación que presta un servicio que aprovechan, sobre todo y con mayor realce, los medios de comunicación con menos recursos que se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional. Es así, que cumplimos con la labor de difundir el trabajo de los estamentos de la Función Ejecutiva que por mandato institucional nos corresponde.</p> <p>Se realizaron 23 transmisiones en El Ciudadano Tv y 20 en radio La Ciudadana.</p> <p>FEBRERO DE 2018</p> <p>En cumplimiento al mandato institucional que nos corresponde y acorde a lo establecido en la estructura vigente de los mencionados medios públicos oficiales, gran parte del trabajo realizado acorde a las necesidades y requerimientos de la Función Ejecutiva se han encaminado a las labores informativas desde distintos espacios. Las transmisiones de las actividades del Señor Presidente de la República del Ecuador, de la Señora Vicepresidenta y de otros altos dignatarios del Gobierno son un producto permanente de los medios de comunicación oficiales para además de transmitir directamente a la ciudadanía, se proporciona información oficial de la Función Ejecutiva a los medios de comunicación con menos recursos que se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional y no cuentan con la capacidad técnica ni operativa para cubrir todos los acontecimientos de la coyuntura nacional.</p> <p>Se realizaron 7 transmisiones en El Ciudadano Tv y 11 en radio La Ciudadana.</p> <p>MARZO DE 2018</p> <p>Además de cumplir con las transmisiones de las actividades del Señor Presidente de la República del Ecuador, de la Señora Vicepresidenta y de otros altos dignatarios del Gobierno, se realizó el mantenimiento preventivo del equipamiento de la cabina de la cabina principal de Radio Ciudadana y del equipamiento de radiofrecuencia del transmisor FM que cubre la ciudad de Quito y sus alrededores, en este mantenimiento se capacitó al personal del área técnica para un soporte de primer nivel.</p> | <p>Khalife Moraga,<br/>Galo Miguel</p> | <p>07/05/2018 -<br/>08:52 AM</p> |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                 | Fecha de última actualización |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| Se realizaron 9 transmisiones en El Ciudadano Tv y 3 en radio La Ciudadana.  |                                |                               |
| DICIEMBRE 2017 - Se realizó mantenimiento mecánico del vehículo Unidad Móvil, se realizaron transmisiones en vivo de las actividades del Sr. Presidente con previas, entrevistas, vocerías desde territorio a fin de informar de forma verás a la ciudadanía.  | Khalife Moraga, Galo Miguel    | 04/01/2018 - 02:46 PM         |
| NOVIEMBRE 2017 - Se inició el proceso de compra de equipamiento para repotenciar la unidad móvil y el master del canal, así como todas las transmisiones desde territorio del presente mes fueron realizadas con la unidad móvil de SECOM. Adicionalmente se realizaron transmisiones en vivo de las actividades del Sr. Presidente con previas, entrevistas, vocerías desde territorio a fin de informar de forma verás a la ciudadanía.  | Acaro Vega, Christian Fernando | 01/12/2017 - 09:22 AM         |
| OCTUBRE 2017 - Se repotenció la unidad móvil a través de la adquisición de nuevo cableado para las cámaras y se reconectorizó las conexiones para garantizar las transmisiones. Adicionalmente se realizaron transmisiones en vivo de las actividades del Sr. Presidente con previas, entrevistas, vocerías desde territorio a fin de informar de forma verás a la ciudadanía.   | Acaro Vega, Christian Fernando | 01/11/2017 - 12:52 PM         |
| SEPTIEMBRE 2017 - Se realizaron transmisiones de las actividades del señor Presidente con el nuevo equipo portátil, lo que ocasionó reducción de recurso en cuanto a movilización de personal a territorio. Adicionalmente se realizaron transmisiones en vivo de las actividades del Sr. Presidente con previas, entrevistas, vocerías desde territorio a fin de informar de forma verás a la ciudadanía.   | Acaro Vega, Christian Fernando | 02/10/2017 - 03:02 PM         |
| AGOSTO 2017 - Se solicitó la autorización definitiva por 15 años de las 47 frecuencias a nivel nacional, así como se realizó el mantenimiento preventivo de la Unidad Móvil. Adicionalmente se realizaron transmisiones en vivo de las actividades del Sr. Presidente con previas, entrevistas, vocerías desde territorio a fin de informar de forma verás a la ciudadanía.  | Acaro Vega, Christian Fernando | 01/09/2017 - 03:05 PM         |
| JULIO 2017 - Se realiza transmisión en vivo de las 3 emisiones del noticiero, se están realizando nuevos programas desde territorio como son: Gobierno para Todos y Construyendo Igualdad y se puso en funcionamiento el equipo profesional para el streaming 24/7 y el nuevo equipo portátil para grabaciones y transmisiones. Adicionalmente se realizaron transmisiones en vivo de las actividades del Sr. Presidente con previas, entrevistas, vocerías desde territorio a fin de informar de forma verás a la ciudadanía. | Acaro Vega, Christian Fernando | 02/08/2017 - 01:04 PM         |
| JUNIO 2017 - Se puso en funcionamiento el nuevo enlace de conexión entre los estudios (GAMA TV) y la estación terrena de transmisión (ECTV), así como se realizó la recepción del equipo profesional para el streaming 24/7 y del nuevo equipo portátil para grabaciones y transmisiones. Adicionalmente, se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes.  | Acaro Vega, Christian Fernando | 03/07/2017 - 10:53 AM         |
| MAYO 2017 - Se realizó las pruebas respectivas para tener un nuevo enlace de conexión entre los estudios (GAMA TV) y la estación terrena de transmisión (ECTV). Adicionalmente, se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes.  | Acaro Vega, Christian Fernando | 02/06/2017 - 02:45 PM         |
| ABRIL 2017 - Se logró suscribir el convenio con ECTV y se han realizado transmisiones locales utilizando un nuevo sistema de streaming con lo que se ha podido salir con reportero desde territorio durante las previas de las transmisiones. Adicionalmente, se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes.  | Acaro Vega, Christian Fernando | 02/05/2017 - 04:11 PM         |
| MARZO 2017 - Se logró suscribir el convenio con CABLEVISIÓN y el convenio con ECTV se encuentra en la etapa final, permitiendo continuar con la operatividad del canal. Adicionalmente, se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes.  | Acaro Vega, Christian Fernando | 03/04/2017 - 04:36 PM         |
| FEBRERO 2017 - Se ha implementado un nuevo programa de entrevistas luego de cada transmisión en vivo, en el cual analistas y ciudadanos conforman un panel para comprender la magnitud de la obra inaugurada y el servicio que prestará a la ciudadanía. Adicionalmente, se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes.   | Acaro Vega, Christian Fernando | 02/03/2017 - 04:27 PM         |
| FEBRERO 2017 - Se encuentra instalados los equipos de las estaciones repetidoras de radio Ciudadana FM en las ciudades de Quito, Guayaquil, Loja, Cuenca, Manta y Portoviejo. Adicionalmente se realizaron transmisiones en vivo de las actividades del Sr. Presidente con previas, entrevistas, vocerías desde territorio a fin de informar de forma verás a la ciudadanía  | Acaro Vega, Christian Fernando | 02/03/2017 - 04:18 PM         |
| ENERO 2017 - Se cuenta con el presupuesto aprobado para la operación del canal el presente año, así como por primera vez se realizaron transmisiones de todas las actividades del señor Presidente desde Italia y España utilizando la tecnología streaming con calidad broadcasting. Adicionalmente, se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes.  | Acaro Vega, Christian Fernando | 03/02/2017 - 01:01 PM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                       | Fecha de última actualización |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| DICIEMBRE 2016 - Se realizó la instalación de dos nuevas repetidoras en las ciudades de Tena y Puyo, por lo que se tiene un total de 45 repetidoras operando a nivel nacional. Adicionalmente, se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes.  | Acaro Vega,<br>Christian<br>Fernando | 03/01/2017 -<br>03:28 PM      |
| NOVIEMBRE 2016 - Se realizó una transmisión simultánea de tres eventos: Coca Codo Sinclair, inicio de construcción del Hospital de Chone afectado por el terremoto y desde el ECU 911 donde se encontraban los presidentes de Ecuador y China, así como se transmitió en vivo los noticieros vespertino y nocturno y un programa especial desde Loja por el tema del Festival de las Artes Vivas. Adicionalmente, se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes.   | Acaro Vega,<br>Christian<br>Fernando | 02/12/2016 -<br>10:00 AM      |
| OCTUBRE 2016 - Se cuenta con las autorizaciones respectivas para la instalación de dos repetidoras adicionales en el oriente ecuatoriano (Tena y Macas), mismas que se tiene previstas que hasta finales del mes de noviembre se encuentren operativas. Adicionalmente, se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes.   | Acaro Vega,<br>Christian<br>Fernando | 01/11/2016 -<br>11:49 AM      |
| SEPTIEMBRE 2016 - Actualmente se cuenta con streaming permanente 24/7 de la nueva programación del canal y se consensuó con PETROECUADOR las condiciones del convenio para realizar mejoras en la cacteta del Cerro Pichincha donde están instalados nuestros equipos de transmisión. Adicionalmente, se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes.   | Acaro Vega,<br>Christian<br>Fernando | 03/10/2016 -<br>01:24 PM      |
| AGOSTO 2016 - Desde el lunes 15 de agosto se lanzó la nueva línea grafica del canal, el cambio de nombre de Ciudadano Tv a TeleCiudadana, la nueva parrilla de programación y el Noticiero Ciudadano en sus 3 emisiones 07h00, 13h00 y 19h00. Adicionalmente, se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes.   | Acaro Vega,<br>Christian<br>Fernando | 02/09/2016 -<br>11:07 AM      |
| JULIO 2016 - Durante el mes se ha lanzado el proceso para la contratación del servicio de streaming profesional para las transmisiones de las actividades de Presidencia, adicionalmente se ha contratado el alquiler de equipo de audio y video para optimizar el uso de señales y grabación para el noticiero del canal. Por otra parte se adecuó el equipo técnico para realizar emisiones en tiempo real utilizando la nueva plataforma en tiempo real de streaming Facebook Live. Finalmente se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes, que suman 17. | Acaro Vega,<br>Christian<br>Fernando | 02/08/2016 -<br>03:46 PM      |
| JUNIO 2016 - Durante el mes se ha finalizado las adecuaciones técnicas para poder unificar los 2 controles másteres a fin de optimizar el recurso humano del canal y se suscribió el convenio interinstitucional con CABLEVISIÓN para contar con el equipamiento para operar el canal. Adicionalmente se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes, que suman 25.   | Acaro Vega,<br>Christian<br>Fernando | 01/07/2016 -<br>03:23 PM      |
| MAYO 2016 - Durante el mes de mayo se realizaron las adecuaciones técnicas para poder transmitir la nueva parrilla de programación y el nuevo informativo que se transmitirá a las 07h00 y 19h00. Adicionalmente se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes de abril, que en total suman 24.  | Acaro Vega,<br>Christian<br>Fernando | 03/06/2016 -<br>10:01 AM      |
| ABRIL 2016 - Durante el mes de abril se realizaron los trámites respectivos para viabilizar la contratación del streaming que se publica en las páginas oficiales de Presidencia y El Ciudadano, así como para el convenio que se mantiene suscrito con ECUADOR TV para la operación del canal. Adicionalmente se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes de abril, que en total suman 30.  | Acaro Vega,<br>Christian<br>Fernando | 03/05/2016 -<br>02:54 PM      |
| MARZO 2016 - Durante el mes de marzo se realizaron las solicitudes de validación por parte del Ministerio de Finanzas de acuerdo a la nueva reglamentación vigente, a fin de iniciar los procesos de contratación respectivos. Adicionalmente se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes de febrero, que suman 32 transmisiones al mes.   | Acaro Vega,<br>Christian<br>Fernando | 04/04/2016 -<br>04:15 PM      |
| FEBRERO 2016 - Durante el mes de febrero se realizaron las validaciones de todos los rubros contemplados en el PAI, obteniendo la aprobación del presupuesto, con el detalle de todos los rubros que serán ejecutados para el año 2016.   | Acaro Vega,<br>Christian<br>Fernando | 16/03/2016 -<br>10:48 AM      |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                       | Fecha de última actualización |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| <p>Adicionalmente se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes de febrero, que suman 30 transmisiones al mes.</p> <p>Para conseguir estos objetivos, los recursos del proyecto fueron organizados para cumplir con las tareas establecidas en los aspectos administrativos, técnicos y operativos</p>   |                                      |                               |
| <p>ENERO 2016.</p> <p>Durante este mes se realizó la planificación del cumplimiento de metas del proyecto de forma concomitante con el presupuesto disponible y los objetivos propios del proyecto, por lo que dicha planificación se plasma en el listado de hitos a cumplirse durante el 2016</p>   | Acaro Vega,<br>Christian<br>Fernando | 15/02/2016 -<br>03:29 PM      |
| <p>DICIEMBRE 2015: En el área de operaciones, se han cumplido con todas las transmisiones requeridas por parte de Presidencia y las actividades propias de SECOM, realizándose en el año 293 transmisiones con un total de 432 horas al aire. Adicionalmente, en el streaming que se publica en las páginas web de Presidencia y El Ciudadano, así como el de You Tube se sobrepasó el millón de visualizaciones.</p>   | Acaro Vega,<br>Christian<br>Fernando | 04/01/2016 -<br>03:31 PM      |
| <p>NOVIEMBRE 2015: En el área de operaciones, se han cumplido con todas las transmisiones requeridas por parte de Presidencia y las actividades propias de SECOM. Adicionalmente, se realizó una migración del satélite por pedido del proveedor internacional y en todas las repetidoras y sistema de audio y video se realizaron los cambios de parámetros satelitales.</p>   | Acaro Vega,<br>Christian<br>Fernando | 04/12/2015 -<br>02:37 PM      |
| <p>OCTUBRE: En el área de operaciones, se han cumplido con todas las transmisiones requeridas por parte de Presidencia y las actividades propias de SECOM. Adicionalmente, se llevó adelante un proceso de evaluación del personal a fin de mejorar los procesos y optimizar recursos, y se inició el proceso de contratación de spots promocionales relacionados con las enmiendas constitucionales</p>  | Acaro Vega,<br>Christian<br>Fernando | 05/11/2015 -<br>03:53 PM      |
| <p>SEPTIEMBRE: En el área de operaciones, se han cumplido con todas las transmisiones requeridas por parte de Presidencia y las actividades propias de SECOM. Adicionalmente se está utilizando un nuevo aplicativo de streaming que permite levantar dicha señal con el uso de un celular y la red de telefonía celular, facilitando de esta manera en caso de alguna emergencia poder obtener una señal básica de streaming.</p>  | Acaro Vega,<br>Christian<br>Fernando | 05/10/2015 -<br>02:50 PM      |
| <p>AGOSTO: Durante el mes de agosto, se han efectuado varias actividades relacionadas al ajuste de presupuestos pues debido a las modificaciones presupuestarias dispuestas por la autoridad de Finanzas se dieron recortes en el presupuesto que requirieron los ajustes a nivel de proyecto. Por otra parte en el área de operaciones, se han cumplido con todas las transmisiones requeridas por parte de Presidencia y las actividades propias de SECOM.</p>                                  | Acaro Vega,<br>Christian<br>Fernando | 03/09/2015 -<br>06:11 PM      |
| <p>JUNIO: A la presente fecha el canal ya cuenta con un canal en YouTube el cual sobrepasa los 1000 suscriptores y existen aproximadamente 100000 visualizaciones de los videos que se encuentran publicados. Adicionalmente se han podido cubrir todas las actividades de inauguración de obras del señor Presidente.</p>  | Acaro Vega,<br>Christian<br>Fernando | 05/08/2015 -<br>05:54 PM      |
| <p>JULIO: A la presente fecha la unidad móvil de la SECOM ha realizado 50 transmisiones de eventos relacionados con la agenda del señor Presidente y se están transmitiendo los programas de interés general que son producidos en el canal Público "Ecuador Tv". Adicionalmente se han tenido que realizar algunas modificaciones en la ejecución del proyecto, en razón de que existió una reducción en el presupuesto, sin embargo las mismas han sido consideradas para el siguiente año.</p> |                                      |                               |
| <p>MAYO 2015: A la presente fecha el canal se encuentra generando el streaming de las actividades del señor Presidente que se visualiza en las páginas web de la Presidencia y El Ciudadano. Adicionalmente se ha realizado las gestiones correspondientes a fin de que ciertos programas de interés general que son producidos en el canal Público "Ecuador Tv" sean transmitidos en nuestro canal.</p>  | Acaro Vega,<br>Christian<br>Fernando | 05/06/2015 -<br>11:36 AM      |
| <p>ABRIL 2015: La señal del canal ahora se encuentra disponible en nuestro canal YOUTUBE Ciudadano TV y se transmiten las actividades oficiales del señor Presidente de la República, en el próximo mes se tiene planificado tener streaming 24/7/365.</p>  | Acaro Vega,<br>Christian<br>Fernando | 04/05/2015 -<br>02:58 PM      |
| <p>MARZO 2015: Al momento el canal cuenta con la unidad móvil para realizar las transmisiones de los eventos del señor Presidente de la República y hasta la presente fecha se han realizado alrededor de 160 transmisiones en vivo correspondiente a alrededor de 250 horas.</p>   | Acaro Vega,<br>Christian<br>Fernando | 02/04/2015 -<br>02:20 PM      |
| <p>ENERO 2015: Al momento el canal está incluido en el 51 % de los sistemas de audio y video por suscripción a nivel nacional y se encuentra incluido en 5 de los 6 sistemas DTH (DIRECTV, TV CABLE, UNIVISA, CLARO TV y CNT TV). La programación está siendo modificada de acuerdo a la parrilla aprobada por el señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones, a fin de cumplir con el porcentaje de producción nacional establecida en la Ley Orgánica de Comunicación.</p>                  | Acaro Vega,<br>Christian<br>Fernando | 04/03/2015 -<br>11:00 AM      |
| <p>FEBRERO 2015: Al momento el canal cuenta con la unidad móvil para realizar las transmisiones de los eventos del señor Presidente de la República y adicionalmente cuenta con el</p>  |                                      |                               |



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                       | Fecha de última actualización |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| equipo técnico y operativo para poner en funcionamiento la misma. La programación está siendo modificada de acuerdo a la parrilla aprobada por el señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones, a fin de cumplir con el porcentaje de producción nacional establecida en la Ley Orgánica de Comunicación.  |                                      |                               |
| NOVIEMBRE: Estamos transmitiendo noticieros de carácter informativo nacional en la mañana, al medio día y en la noche que la productora local contratada nos entrega y hasta la presente fecha se han realizado alrededor de 100 transmisiones en vivo de eventos del Gobierno Nacional; adicionalmente, nos encontramos 24/7/365 en DIRECTV en el canal 177<br><br>DICIEMBRE: Al momento el proyecto cuenta con 43 repetidoras UHF canal 48 y 49 al aire respectivamente, en 20 provincias del país y estamos incluidos en el 38 % de los sistemas de audio y video por suscripción a nivel nacional. La programación está siendo modificada de acuerdo a la parrilla aprobada por el señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones, a fin de cumplir con el porcentaje de producción nacional establecida en la Ley Orgánica de Comunicación. | Acaro Vega,<br>Christian<br>Fernando | 05/01/2015 -<br>03:16 PM      |
| OCTUBRE: Al momento el proyecto cuenta con 43 repetidoras UHF canal 48 y 49 al aire respectivamente, en 20 provincias del país enlazadas vía satélite dese un control master digital calidad SD que ha sido alquilado junto con estudios, cabina de locución, equipo técnico y operativo necesarios para la operación. Se cuenta también con programación de carácter informativo nacional contratada con una productora local; y, a la presente fecha estamos siendo retransmitidos por el 30% de los sistemas de audio y video por suscripción a nivel nacional.  | Suárez Callejas,<br>Diego            | 06/11/2014 -<br>09:55 AM      |

Riesgos cerrados: 17, Abiertos: 0

**LOCALIDADES**

| Localidad de Impacto |  |
|----------------------|--|
| 1                    | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 |

**HITOS**

|   | Hito   | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | EJECUCIÓN: Solicitud firmada de convenio de pago por estudios de ingeniería de frecuencias   | 3-Adjudicación            | 14/10/2014         |                | 13/10/2014 |          | Sí            | 0.8           |
| 2 | EJECUCIÓN: Informe firmado de avance de cobertura en sistemas AVS                            | 5-Entregables Intermedios | 17/10/2014         |                | 17/10/2014 |          | Sí            | 1.6           |
| 3 | EJECUCIÓN: Informe firmado de operación de repetidoras a nivel nacional.                     | 5-Entregables Intermedios | 17/10/2014         |                | 17/10/2014 |          | Sí            | 1.6           |
| 4 | EJECUCIÓN: Contrato suscrito para la adquisición de programación con contenidos nacionales.  | 4-Inicio de Trabajo       | 20/10/2014         |                | 20/10/2014 |          | Sí            | 1.6           |
| 5 | EJECUCIÓN: Convenio para retransmisión con la operadora DirecTV                              | 4-Inicio de Trabajo       | 17/11/2014         |                | 11/11/2014 |          | Sí            | 0.8           |
| 6 | EJECUCIÓN: Convenio de pago firmado por elaboración de estudios de ingeniería de frecuencias | 4-Inicio de Trabajo       | 28/11/2014         |                | 18/11/2014 |          | Sí            | 0.8           |
| 7 | EJECUCIÓN: Estudio Financiero elaborado para autorización definitiva                         | 5-Entregables Intermedios | 28/11/2014         |                | 28/11/2014 |          | Sí            | 1.6           |
| 8 | EJECUCIÓN: Informe firmado con TDRs para adquisición   | 5-Entregables Intermedios | 28/11/2014         |                | 28/11/2014 |          | Sí            | 0.8           |

HITOS

|    | Hito  | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
|    | estación terrena, MAM, Control Master, Equipamiento estudios  |                           |                    |                |            |          |               |               |
| 9  | EJECUCIÓN: Adendum a convenio con ECTV firmado para instalación de 5 repetidoras adicionales  | 4-Inicio de Trabajo       | 15/12/2014         |                | 15/12/2014 |          | Sí            | 0.8           |
| 10 | EJECUCIÓN: Informe firmado de requerimiento de espacio físico para instalación de estudios, control master, control técnico y estación terrena. | 5-Entregables Intermedios | 15/12/2014         |                | 15/12/2014 |          | Sí            | 0.8           |
| 11 | EJECUCIÓN: Informe firmado de avance de instalación de las 5 repetidoras y cobertura sistemas AVS   | 5-Entregables Intermedios | 19/12/2014         |                | 19/12/2014 |          | Sí            | 1.6           |
| 12 | EJECUCIÓN: Informe firmado de requerimiento de alquiler del control master para el año 2015   | 5-Entregables Intermedios | 19/12/2014         |                | 19/12/2014 |          | Sí            | 0.8           |
| 13 | EJECUCIÓN: Plan Comunicacional elaborado para la autorización definitiva de frecuencias   | 5-Entregables Intermedios | 23/12/2014         |                | 23/12/2014 |          | Sí            | 1.6           |
| 14 | EJECUCIÓN: Solicitud de autorización de frecuencias definitiva ingresada a la autoridad de telecomunicaciones                                   | 9-Entregables Formales    | 09/01/2015         |                | 09/01/2015 |          | Sí            | 1.6           |
| 15 | EJECUCIÓN: Informe firmado de requerimiento de transferencia de fondos por convenio ECTV para el año 2015.                                      | 4-Inicio de Trabajo       | 09/01/2015         |                | 09/01/2015 |          | Sí            | 0.8           |
| 16 | EJECUCIÓN: Informe firmado con TDRs para consultoría de diseño físico y arquitectónico de estudios.   | 5-Entregables Intermedios | 16/01/2015         |                | 16/01/2015 |          | Sí            | 0.8           |
| 17 | EJECUCIÓN: Informe firmado con TDRs para consultoría de diseño físico y arquitectónico de estudios  | 5-Entregables Intermedios | 16/02/2015         |                | 16/02/2015 |          | Sí            | 0.8           |
| 18 | EJECUCIÓN: Informe final firmado de instalación de 5 repetidoras  | 9-Entregables Formales    | 20/02/2015         |                | 20/02/2015 |          | Sí            | 1.6           |
| 19 | EJECUCIÓN: Contrato firmado de alquiler del control Master  | 4-Inicio de Trabajo       | 27/02/2015         |                | 27/02/2015 |          | Sí            | 1.6           |
| 20 | EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción firmada, de consultoría para diseño físico y arquitectónico de estudios.                                   | 5-Entregables Intermedios | 30/03/2015         |                | 30/03/2015 |          | Sí            | 0.8           |
| 21 | EJECUCIÓN: Informe firmado de avance de obtención de frecuencias definitivas para El ciudadano TV   | 5-Entregables Intermedios | 30/03/2015         |                | 30/03/2015 |          | Sí            | 0.8           |
| 22 | EJECUCIÓN: Informe firmado con TDRs para adecuación de espacios físicos y arquitectónicos.  | 5-Entregables Intermedios | 10/04/2015         |                | 10/04/2015 |          | Sí            | 0.8           |
| 23 | EJECUCIÓN: Resolución de autorización definitiva  | 9-Entregables Formales    | 30/04/2015         |                | 30/04/2015 |          | Sí            | 1.6           |

HITOS

|    | Hito   | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo  | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|--|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
|    | de frecuencias emitida por la autoridad de telecomunicaciones  |  |                    |                |            |   |               |               |
| 24 | EJECUCIÓN: Informe firmado de avance de los procesos de adquisición del equipamiento para estudios, control master, estación terrena y MAM   | 5-Entregables Intermedios              | 29/05/2015         |                | 29/05/2015 |    | Sí            | 0.8           |
| 25 | EJECUCIÓN: Informe firmado de avance del proceso de contratación de adecuaciones físicas y arquitectónicas de los estudios   | 5-Entregables Intermedios              | 29/05/2015         |                | 29/05/2015 |    | Sí            | 0.8           |
| 26 | EJECUCIÓN: Informe de TDRs para la adquisición de equipamiento para Streaming del Canal  | 5-Entregables Intermedios              | 19/06/2015         |                | 19/06/2015 |    | Sí            | 0.8           |
| 27 | EJECUCIÓN: Informe firmado del avance del proceso de adquisición de equipamiento para Streaming del Canal  | 9-Entregables Formales                 | 27/07/2015         |                | 27/07/2015 |    | Sí            | 0.8           |
| 28 | EJECUCIÓN: Informe firmado de TDRs para la adquisición de: SISTEMA PORTÁTIL DE PRODUCCIÓN DE EXTERIORES SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEÑALES DE AUDIO Y VIDEO PROFESIONAL PTP SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AUDIO Y VIDEO PROFESIONAL OFFLINE PARA EL CIUDADANO TV | 5-Entregables Intermedios              | 28/08/2015         |                | 28/08/2015 |    | Sí            | 0.8           |
| 29 | EJECUCIÓN: Informe de TDRs para la CONTRATACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CÁPSULAS INFORMATIVAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA EL CIUDADANO TV   | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 28/09/2015         |                | 28/09/2015 |  | Sí            | 1.6           |
| 30 | EJECUCIÓN: Informe firmado de avance del proceso de adquisición de equipamiento para los SISTEMAS PORTÁTIL DE PRODUCCIÓN DE EXTERIORES, TRANSMISIÓN DE SEÑALES DE AUDIO Y VIDEO PROFESIONAL PTP Y DE ALMACENAMIENTO DE AUDIO Y VIDEO PROFESIONAL OFFLINE       | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 29/10/2015         |                | 29/10/2015 |  | Sí            | 1.6           |
| 31 | EJECUCIÓN: Informe firmado de avance del proceso de adquisición de equipamiento para la CONTRATACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CÁPSULAS INFORMATIVAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA EL CIUDADANO TV  | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 27/11/2015         |                | 27/11/2015 |  | Sí            | 1.6           |
| 32 | EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción firmada del alquiler del control master   | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 11/12/2015         |                | 11/12/2015 |  | Sí            | 1.6           |

HITOS

|    | Hito   | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 33 | EJECUCIÓN: Actas de entrega recepción firmada de CONTRATACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CÁPSULAS INFORMATIVAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA EL CIUDADANO TV   | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 23/12/2015         |                | 23/12/2015 |          | Sí            | 1.6           |
| 34 | EJECUCIÓN: Actas de entrega recepción firmada de CONTROL MASTER DE STREAMING PARA MÚLTIPLES SEÑALES SD/ HD SISTEMA PORTÁTIL DE PRODUCCIÓN DE EXTERIORES Y SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEÑALES DE AUDIO Y VIDEO PROFESIONAL PTP | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 23/12/2015         |                | 23/12/2015 |          | Sí            | 1.6           |
| 35 | CIERRE: Informes final firmado de la implementación del proyecto "El Ciudadano TV"   | V - Verificación ejecutiva             | 29/12/2015         |                | 29/12/2015 |          | Sí            | 0.8           |
| 36 | EJECUCIÓN: Informe de Planificación 2016   | 5-Entregables Intermedios              | 31/01/2016         |                | 31/01/2016 |          | Sí            | 0.8           |
| 37 | EJECUCIÓN: TDR´s de Alquiler equipos del control Master  | 5-Entregables Intermedios              | 22/02/2016         |                | 22/02/2016 |          | Sí            | 1.6           |
| 38 | EJECUCIÓN: Producción de pastillas informativas para radio contratadas   | 5-Entregables Intermedios              | 14/03/2016         |                | 14/03/2016 |          | Sí            | 1.6           |
| 39 | EJECUCIÓN: Borrador de Convenio con Ecuador TV elaborado   | 5-Entregables Intermedios              | 20/03/2016         |                | 20/03/2016 |          | Sí            | 0.8           |
| 40 | EJECUCIÓN: TDR's de streaming elaborado  | 5-Entregables Intermedios              | 30/03/2016         |                | 30/03/2016 |          | Sí            | 1.6           |
| 41 | EJECUCIÓN: Convenio con Ecuador TV aprobado y firmado  | 5-Entregables Intermedios              | 11/04/2016         |                | 11/04/2016 |          | Sí            | 1.6           |
| 42 | EJECUCIÓN: Servicio de streaming contratado  | 5-Entregables Intermedios              | 15/04/2016         |                | 15/04/2016 |          | Sí            | 1.6           |
| 43 | EJECUCIÓN: Informe de Operación de canal mayo  | 5-Entregables Intermedios              | 20/05/2016         |                | 20/05/2016 |          | Sí            | 1.6           |
| 44 | EJECUCIÓN: Informe de Operación de canal junio   | 5-Entregables Intermedios              | 24/06/2016         |                | 24/06/2016 |          | Sí            | 1.6           |
| 45 | EJECUCIÓN: Informe de Operación de canal julio   | 5-Entregables Intermedios              | 24/07/2016         |                | 24/07/2016 |          | Sí            | 0.8           |
| 46 | EJECUCIÓN: Informe de Operación de canal agosto  | 5-Entregables Intermedios              | 30/08/2016         |                | 30/08/2016 |          | Sí            | 0.8           |
| 47 | EJECUCIÓN: Informe de Operación de canal septiembre  | 5-Entregables Intermedios              | 30/09/2016         |                | 30/09/2016 |          | Sí            | 0.8           |
| 48 | EJECUCIÓN: Informe de Operación de canal octubre   | 5-Entregables Intermedios              | 30/10/2016         |                | 30/10/2016 |          | Sí            | 0.8           |
| 49 | EJECUCIÓN: Informe de Operación de canal noviembre   | 5-Entregables Intermedios              | 30/11/2016         |                | 30/11/2016 |          | Sí            | 0.8           |
| 50 | EJECUCIÓN: Informe anual del proyecto Canal El Ciudadano TV  | 9-Entregables Formales                 | 30/12/2016         |                | 30/12/2016 |          | Sí            | 1.6           |
| 51 | EJECUCIÓN: Presupuesto aprobado para el proyecto en el año 2017  | 5-Entregables Intermedios              | 30/01/2017         |                | 30/01/2017 |          | Sí            | 1.6           |

HITOS

|    | Hito   | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 52 | EJECUCIÓN: Informe firmado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de enero   | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2017         |                | 31/01/2017 |          | Sí            | 0.8           |
| 53 | EJECUCIÓN: Contratación firmada del servicio de streaming corporativo para TELECIUDADANA                                 | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2017         |                | 28/02/2017 |          | Sí            | 0.8           |
| 54 | EJECUCIÓN: Informe firmado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de febrero | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2017         |                | 28/02/2017 |          | Sí            | 0.8           |
| 55 | EJECUCIÓN: Convenio Interinstitucional con CABLEVISIÓN renovado  | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2017         |                | 31/03/2017 |          | Sí            | 0.8           |
| 56 | EJECUCIÓN: Convenio Interinstitucional con ECTV ratificado   | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2017         |                | 31/03/2017 |          | Sí            | 0.8           |
| 57 | EJECUCIÓN: Informe firmado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de marzo   | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2017         |                | 31/03/2017 |          | Sí            | 0.8           |
| 58 | EJECUCIÓN: Informe firmado de cumplimiento de metas del proyecto   | 5-Entregables Intermedios | 28/04/2017         |                | 28/04/2017 |          | Sí            | 1.6           |
| 59 | EJECUCIÓN: Informe firmado de mantenimiento preventivo de la Unidad Móvil y Grupo electrógeno I Cuatrimestre             | 5-Entregables Intermedios | 28/04/2017         |                | 28/04/2017 |          | Sí            | 0.8           |
| 60 | EJECUCIÓN: Informe firmado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de abril   | 5-Entregables Intermedios | 28/04/2017         |                | 28/04/2017 |          | Sí            | 0.8           |
| 61 | EJECUCIÓN: Informe firmado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de mayo    | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2017         |                | 31/05/2017 |          | Sí            | 0.8           |
| 62 | EJECUCIÓN: Informe firmado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de junio   | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2017         |                | 30/06/2017 |          | Sí            | 0.8           |
| 63 | EJECUCIÓN: Informe firmado de instalación de repetidoras y cobertura para el proyecto I semestre                         | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2017         |                | 31/07/2017 |          | Sí            | 0.8           |
| 64 | EJECUCIÓN: Informe firmado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de julio   | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2017         |                | 31/07/2017 |          | Sí            | 0.8           |
| 65 | EJECUCIÓN: Informe firmado cuatrimestral de cumplimiento de metas del proyecto   | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2017         |                | 31/08/2017 |          | Sí            | 1.6           |
| 66 | EJECUCIÓN: Informe firmado de mantenimiento preventivo   | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2017         |                | 31/08/2017 |          | Sí            | 0.8           |

HITOS

|    | Hito   | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
|    | de la Unidad Móvil y Grupo electrógeno II Cuatrimestre   |                           |                    |                |            |          |               |               |
| 67 | EJECUCIÓN: Informe firmado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de septiembre          | 5-Entregables Intermedios | 29/09/2017         |                | 29/09/2017 |          | Sí            | 0.8           |
| 68 | EJECUCIÓN: Informe firmado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de octubre             | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2017         |                | 31/10/2017 |          | Sí            | 0.8           |
| 69 | EJECUCIÓN: Informe firmado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de noviembre           | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2017         |                | 30/11/2017 |          | Sí            | 0.8           |
| 70 | EJECUCIÓN: Informe firmado cuatrimestral de cumplimiento de metas del proyecto   | 5-Entregables Intermedios | 29/12/2017         |                | 29/12/2017 |          | Sí            | 1.6           |
| 71 | EJECUCIÓN: Informe firmado de instalación de repetidoras y cobertura para el proyecto II semestre                                    | 5-Entregables Intermedios | 29/12/2017         |                | 29/12/2017 |          | Sí            | 0.8           |
| 72 | EJECUCIÓN: Informe firmado de mantenimiento preventivo de la Unidad Móvil y Grupo electrógeno III Cuatrimestre                       | 5-Entregables Intermedios | 29/12/2017         |                | 29/12/2017 |          | Sí            | 0.8           |
| 73 | EJECUCIÓN: Informe elaborado de transmisiones de actividades de la Función Ejecutiva en el mes de enero                              | 5-Entregables Intermedios | 30/01/2018         |                | 30/01/2018 |          | Sí            | 0.41          |
| 74 | EJECUCIÓN: Presupuesto aprobado para el proyecto en el año 2018  | 4-Inicio de Trabajo       | 30/01/2018         |                | 30/01/2018 |          | Sí            | 1.86          |
| 75 | EJECUCIÓN: Informe elaborado de transmisiones de actividades de la Función Ejecutiva en el mes de febrero                            | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2018         |                | 28/02/2018 |          | Sí            | 1.34          |
| 76 | EJECUCIÓN: Informe elaborado de transmisiones de actividades de la Función Ejecutiva en el mes de marzo                              | 5-Entregables Intermedios | 30/03/2018         |                | 30/03/2018 |          | Sí            | 1.75          |
| 77 | EJECUCIÓN: Informe elaborado de cumplimiento de metas del proyecto   | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2018         |                | 30/04/2018 |          | Sí            | 1.03          |
| 78 | EJECUCIÓN: Informe elaborado de mantenimiento preventivo de equipo electrónico de la Unidad Móvil y Grupo electrógeno I Cuatrimestre | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2018         |                | 30/04/2018 |          | Sí            | 1.03          |
| 79 | EJECUCIÓN: Informe elaborado de transmisiones de TELECIUDADANA en el mes de abril  | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2018         |                | 30/04/2018 |          | Sí            | 0.41          |
| 80 | EJECUCIÓN: Informe elaborado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de mayo              | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2018         |                | 31/05/2018 |          | Sí            | 0.41          |


**HITOS**

|    | Hito   | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 81 | EJECUCIÓN: Informe elaborado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de junio               | 5-Entregables Intermedios | 29/06/2018         |                | 29/06/2018 |          | Sí            | 1.03          |
| 82 | EJECUCIÓN: Informe elaborado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de julio               | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2018         |                | 31/07/2018 |          | Sí            | 1.44          |
| 83 | EJECUCIÓN: Informe elaborado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de agosto              | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2018         |                | 31/08/2018 |          | Sí            | 0.92          |
| 84 | Informe elaborado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de septiembre                     | 5-Entregables Intermedios | 28/09/2018         |                | 28/09/2018 |          | Sí            | 0.92          |
| 85 | EJECUCIÓN: Informe elaborado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de octubre             | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2018         | 31/10/2018     |            |          | No            | 0.92          |
| 86 | EJECUCIÓN: Informe elaborado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de noviembre           | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2018         | 30/11/2018     |            |          | No            | 0.92          |
| 87 | EJECUCIÓN: Contratación realizada del servicio de streaming corporativo para TELECIUDADANA por un período de 305 días                  | 5-Entregables Intermedios | 28/12/2018         | 28/12/2018     |            |          | No            | 0.64          |
| 88 | EJECUCIÓN: Informe elaborado cuatrimestral de cumplimiento de metas del proyecto   | 5-Entregables Intermedios | 28/12/2018         | 28/12/2018     |            |          | No            | 1.03          |
| 89 | EJECUCIÓN: Informe elaborado de instalación de repetidoras y cobertura para el proyecto II semestre                                    | 5-Entregables Intermedios | 28/12/2018         | 28/12/2018     |            |          | No            | 1.05          |
| 90 | EJECUCIÓN: Informe elaborado de mantenimiento preventivo de equipo electrónico de la Unidad Móvil y Grupo electrógeno III Cuatrimestre | 5-Entregables Intermedios | 28/12/2018         | 28/12/2018     |            |          | No            | 1.03          |
| 91 | EJECUCIÓN: Convenio Interinstitucional firmado   | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2018         | 31/12/2018     |            |          | No            | 1.86          |

**INDICADORES DEL PROYECTO**

|   | Indicador  | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|--|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Porcentaje de repetidoras instaladas y operativas. |        | 45.35 %           | 0.98 | 0.4444                | 01/01/2018      | Ene-Jun                    |
| 2 | Porcentaje de convenios suscritos.                 |        | -                 | -    | -                     | 01/01/2018      | -                          |

**INDICADORES DEL PROYECTO**

|   | Indicador  | Estado  | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|--|---|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 3 | Porcentaje de mantenimientos realizados a la unidad móvil. |  | 101.02 %          | 0.66 | 0.6667                | 01/01/2018      | May-Ago                    |




**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Anticipo Desembolsado:        | 925,587.20      |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 6,725,587.78 ** |
| Costo Total:                  | 8,246,360.74    |
| Total Devengado:              | 6,015,177.80    |
| % Costo Total Devengado:      | 72.94 %         |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**




% Costo Total Devengado: 72.94 %

**Perfil Económico 2018**

|   | Años Previos        | Año Actual (2018)   | Años Futuros | Total               |
|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Ppto. Planeado  | 7,571,489.05        | 2,337,523.98        | 0.00         | <b>9,909,013.03</b> |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 0.00                | 0.00                | 0.00         | <b>0.00</b>         |
| <b>Ppto. Aprobado Inicial</b>                           | <b>8,226,640.40</b> | <b>1,333,492.70</b> | <b>0.00</b>  | <b>9,560,133.10</b> |
| Ppto. Codificado  | 6,132,876.76        | 470,644.34          | 0.00         | <b>6,603,521.10</b> |
| Ppto. Comprometido                                      | 5,886,145.44        | 178,093.29          | 0.00         | <b>6,064,238.73</b> |
| Planeado - Codificado (2018)                            |                     | 1,866,879.64        |              |                     |
| <b>Programado a Devengar</b>                            | <b>7,489,079.55</b> | <b>888,433.27</b>   | <b>0.00</b>  | <b>8,377,512.82</b> |
| Ppto. Devengado   | 5,837,154.51        | 178,023.29          | 0.00         | <b>6,015,177.80</b> |
| Pagado Real   | 3,693,489.51        | 177,716.19          | 0.00         | <b>3,871,205.70</b> |
| Estimado a fin de año                                   | * 5,837,154.51      | 804,250.00          | 0.00         | <b>6,641,404.51</b> |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 1,651,925.04        | 84,183.27           | 0.00         | <b>1,736,108.31</b> |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 77.94 %           | 20.04 %             | 0.00 %       | <b>71.80 %</b>      |
| <b>Ppto. Codificado 998</b>                             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>         |
| <b>Ppto. Devengado 998</b>                              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>         |

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018**

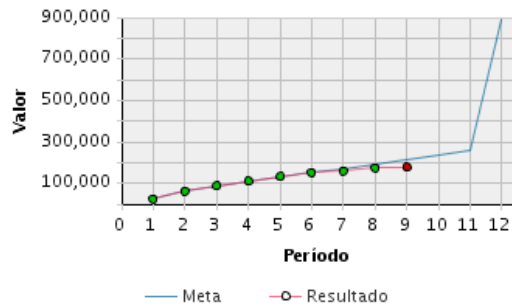

**Presupuesto Mensual 2018**

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado                               | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| Ene | 24,802.40                  | 24,802.40           | 24,802.40                    | 24,802.40             | 100.00 %         | <span style="color: green;">●</span> | 2.79 %       |

| Presupuesto Mensual 2018 |                            |                     |                              |                       |                  |        |              |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes                      | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb                      | 35,684.45                  | 35,684.45           | 60,486.85                    | 60,486.85             | 100.00 %         |        | 6.81 %       |
| Mar                      | 27,310.89                  | 27,310.89           | 87,797.74                    | 87,797.74             | 100.00 %         |        | 9.88 %       |
| Abr                      | 24,251.21                  | 24,251.21           | 112,048.95                   | 112,048.95            | 100.00 %         |        | 12.61 %      |
| May                      | 19,354.79                  | 19,354.79           | 131,403.74                   | 131,403.74            | 100.00 %         |        | 14.79 %      |
| Jun                      | 19,162.89                  | 19,162.89           | 150,566.63                   | 150,566.63            | 100.00 %         |        | 16.95 %      |
| Jul                      | 20,922.96                  | 10,302.43           | 171,489.59                   | 160,869.06            | 93.81 %          |        | 18.11 %      |
| Ago                      | 20,922.96                  | 14,398.13           | 192,412.55                   | 175,267.19            | 91.09 %          |        | 19.73 %      |
| Sep                      | 20,922.96                  | 2,756.10            | 213,335.51                   | 178,023.29            | 83.45 %          |        | 20.04 %      |
| Oct                      | 20,922.96                  |                     | 234,258.47                   |                       |                  |        |              |
| Nov                      | 20,922.96                  |                     | 255,181.43                   |                       |                  |        |              |
| Dic                      | 633,251.84                 |                     | 888,433.27                   |                       |                  |        |              |
| <b>Total</b>             | <b>888,433.27</b>          | <b>178,023.29</b>   |                              |                       |                  |        |              |

## OBJETIVOS ALINEADOS

### Objetivos Operativos

|   |   |
|---|---|
| 6 | Incrementar la audiencia de los mensajes y productos comunicacionales que se difunden de las actividades del Gobierno MEDIANTE la innovación permanente de contenidos y mecanismos de difusión. |
|---|---|

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo   | Archivo   | Fecha de Alta |
|----|--|---|---------------|
| 1  | Cedula presupuestaria Diciembre 2014   | Cedula_presupuestaria_Diciembre_2014.pdf                  | 05/01/2015    |
| 2  | Cedula presupuestaria Febrero 2015   | Cedula_presupuestaria_Febrero_de_2015.pdf                 | 04/03/2015    |
| 3  | Cedula presupuestaria noviembre  | Cedula_Presupuestaria_Noviembre.pdf                       | 03/12/2014    |
| 4  | EJECUCION: Informe elaborado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de julio                       | Radio-Streaming-Unidad_Movil_-_David_Chavez.pdf           | 06/08/2018    |
| 5  | Hito - 14 Solicitud de autorización de frecuencias definitiva ingresada a la autoridad de telecomunicaciones                                   | Solicitud__Sostenibilidad_Económica_y_Plan_Comunicaciona  | 04/02/2015    |
| 6  | Hito - 14.1 Solicitud de autorización de frecuencias definitiva ingresada a la autoridad de telecomunicaciones                                 | Estudio_de_ingenieria.pdf                                 | 04/02/2015    |
| 7  | Hito - 15 Informe firmado de requerimiento de transferencia de fondos por convenio ECTV para el año 2015.                                      | INFORME_NO_04-2015_Informe_de_convenio_ECTV.pdf           | 04/02/2015    |
| 8  | Hito - 16 Informe firmado con TDRs para consultoría de diseño físico y arquitectónico de estudios.   | TDR_consultoria_arquitectónica_CTV_final.pdf              | 04/02/2015    |
| 9  | HITO - 69 Informe firmado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de noviembre                      | Informe_No._41_Informe_de_Operación_Noviembre.pdf         | 01/12/2017    |
| 10 | HITO 10 - Informe firmado de requerimiento de espacio físico para instalación de estudios, control master, control técnico y estación terrena. | Requerimiento_de_espacios_fisicos_CTV.pdf                 | 05/01/2015    |
| 11 | Hito 11 - Informe firmado de avance de instalación de las 5 repetidoras y cobertura sistemas AVS   | Informe_Cobertura_y_Cables_Diciembre_2014.pdf             | 05/01/2015    |
| 12 | Hito 11.1 - Informe firmado de avance de instalación de las 5 repetidoras y cobertura sistemas AVS   | Informe_de_avance_de_instalación_de_las_5_repetidoras.pdf | 05/06/2015    |
| 13 | HITO 12 - Informe firmado de requerimiento de alquiler del control master para el año 2015   | Requerimiento_alquiler_de_control_máster_2015.pdf         | 05/01/2015    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|    | Descripción de Archivo   | Archivo   | Fecha de Alta |
|----|--|---|---------------|
| 14 | HITO 13 - Plan Comunicacional elaborado para la autorización definitiva de frecuencias   | PLAN_COMUNICACIONAL_05-01-2015.pdf  | 05/01/2015    |
| 15 | Hito 17 Informe firmado con TDRs para consultoría de diseño físico y arquitectónico de estudios  | TDR_consultoria_arquitectónica_CTV_final.pdf                              | 04/03/2015    |
| 16 | Hito 18 - Informe final firmado de instalación de 5 repetidoras  | INFORME_No_2015-02_Instalación_5_repetidoras.pdf                          | 04/03/2015    |
| 17 | Hito 19 Contrato firmado de alquiler del control Master  | INFORME_No_2015-03_Status_alquiler_CABLEVISION.pdf                        | 04/03/2015    |
| 18 | Hito 2 - Hito 3. Informe firmado de operación de repetidoras y sistemas de AVS a nivel nacional  | Informe_cobertura_señal_abierta_y_SAVS.pdf                                | 04/11/2014    |
| 19 | Hito 20 - Acta de entrega recepción firmada, de consultoría para diseño físico y arquitectónico de estudios.   | INFORME_No_2015-04_Informe_Actas_Consultoria_diseños_0204.pdf             | 02/04/2015    |
| 20 | Hito 21 - Informe firmado de avance de obtención de frecuencias definitivas para El ciudadano TV   | INFORME_No_2015-05_Estado_de_solicitud_definitiva_de_frecuencias_0204.pdf | 02/04/2015    |
| 21 | HITO 22 - Informe firmado con TDRs para adecuación de espacios físicos y arquitectónicos.  | INFORME_No_2015-05_Informe_TDRs_para_las_adequaciones_0405.pdf            | 04/05/2015    |
| 22 | Hito 23 - Resolución de autorización definitiva de frecuencias emitida por la autoridad de telecomunicaciones  | INFORME_No_2015-07_Informe_de_autorización_de_frecuencias_0405.pdf        | 04/05/2015    |
| 23 | HITO 24 Informe firmado de avance de los procesos de adquisición del equipamiento para estudios, control master, estación terrena y MAM  | INFORME_No_2015-08_Informe PROCESOS_ADQUISICIÓN_0306.pdf                  | 03/06/2015    |
| 24 | HITO 25 - Informe firmado de avance del proceso de contratación de adecuaciones físicas y arquitectónicas de los estudios  | INFORME_No_2015-09_Informe_de_avance_del_proceso_de_0306.pdf              | 03/06/2015    |
| 25 | Hito 26 - Informe firmado con TDRs para adquisición de sistemas de transmisión para TDT  | Términos_de_referencia_STREAMING.pdf                                      | 04/07/2015    |
| 26 | Hito 27 - Informe firmado del avance del proceso de adquisición de equipamiento para Streaming del Canal   | INFORME_No_2015-12_Avance_de_adquisición_de_sistema_0508.pdf              | 05/08/2015    |
| 27 | Hito 28: Informe firmado de TDRs para la adquisición de: SISTEMA PORTÁTIL DE PRODUCCIÓN DE EXTERIORES SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEÑALES DE AUDIO Y VIDEO PROFESIONAL PTP SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AUDIO Y VIDEO PROFESIONAL OFFLINE PARA EL CIUDADANO TV | Informe_agosto.pdf  | 03/09/2015    |
| 28 | Hito 29 - Informe de TDRs para la CONTRATACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CÁPSULAS INFORMATIVAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA EL CIUDADANO TV  | INFORME-TDRS.pdf  | 05/10/2015    |
| 29 | Hito 30 - Informe firmado de avance del proceso de adquisición de equipamiento para los SISTEMAS PORTÁTIL DE PRODUCCIÓN DE EXTERIORES, TRANSMISIÓN DE SEÑALES DE AUDIO Y VIDEO PROFESIONAL PTP Y DE ALMACENAMIENTO DE AUDIO Y VIDEO PROFESIONAL OFFLINE      | Informe_firmado_de_avance_del_proceso_de_adquisición_de_0510.pdf          | 05/10/2015    |
| 30 | Hito 31 - Informe firmado de avance del proceso de adquisición de equipamiento para la CONTRATACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CÁPSULAS INFORMATIVAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA EL CIUDADANO TV   | INFORME_No_2015-19_Contratación_de_pastillas.pdf                          | 04/12/2015    |
| 31 | HITO 32 - Acta de entrega recepción firmada del alquiler del control master  | Informe_Acta_Alquiler_Master.pdf  | 04/01/2016    |
| 32 | Hito 33 - Actas de entrega recepción firmada de CONTRATACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CÁPSULAS INFORMATIVAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA EL CIUDADANO TV  | Informe_Acta_Pastillas_Turísticas.pdf                                     | 04/01/2016    |
| 33 | Hito 34 - Actas de entrega recepción firmada de CONTROL MASTER DE STREAMING PARA MÚLTIPLES SEÑALES SD/HD SISTEMA PORTÁTIL DE PRODUCCIÓN DE EXTERIORES Y SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEÑALES DE AUDIO Y VIDEO PROFESIONAL PTP                                   | Informe_Acta_Master_Streaming.pdf   | 04/01/2016    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|    | Descripción de Archivo  | Archivo   | Fecha de Alta |
|----|---|---|---------------|
| 34 | Hito 35 - Informes final firmado de la implementación del proyecto "El Ciudadano TV"                                    | Informe__final_2015_ejecución_del_proyecto.pdf  | 04/01/2016    |
| 35 | HITO 36 - Informe de Planificación 2016   | Informe_Planificación_2016_CTV.pdf  | 15/03/2016    |
| 36 | Hito 37 - TDR's de Alquiler equipos del control Master  | Informe_Febrero_TDR_Alquiler.pdf  | 15/03/2016    |
| 37 | Hito 38 - Producción de pastillas informativas para el canal contratadas  | INFORME_No_2016-03_Informe_de_Contratación_de_pastillas_informativas.pdf                      | 04/01/2016    |
| 38 | HITO 39 - Borrador de Convenio con Ecuador TV elaborado   | INFORME_No_2016-04_Informe_de_Ejecución_de_Convenio_40470.pdf                                 | 04/07/2016    |
| 39 | Hito 4. Contrato suscrito para la adquisición de programación con contenidos nacionales                                 | Contrato_de_Programación.pdf  | 04/11/2014    |
| 40 | HITO 4.1 - Contrato de adquisición de programación con contenidos nacionales  | Contrato_de_adquisición_de_programación_con_contenidos_nacionales.pdf                         | 05/06/2015    |
| 41 | hito 40 - TDR's de streaming elaborado  | INFORME_No_2016-05_Informe_de_elaboración_de_TDRs_54042016 Streaming.pdf                      | 04/07/2016    |
| 42 | Hito 41 - Convenio con Ecuador TV aprobado y firmado  | INFORME_No_2016-06_Informe_de_Ejecución_de_Convenio_40572016.pdf                              | 04/07/2016    |
| 43 | Hito 42 - Servicio de streaming contratado  | INFORME_No_2016-07_Informe_de_elaboración_de_Servicio_03052016 Streaming.pdf                  | 03/05/2016    |
| 44 | Hito 43 - Informe de Operación de canal mayo  | INFORME_No_2016-10_Operación_Mayo.pdf   | 03/06/2016    |
| 45 | HITO 44 - Informe de Operación de canal junio   | INFORME_No_2016-11_Operación_Junio.pdf  | 01/07/2016    |
| 46 | HITO 45 - Informe de Operación de canal del mes de julio  | INFORME_No_2016-12_Operación_Julio.pdf  | 02/08/2016    |
| 47 | HITO 46 - Informe de Operación de canal agosto  | Informe_de_cumplimiento_mensual_GPR_agosto_2016.pdf   | 02/09/2016    |
| 48 | Hito 47 - Informe de Operación de canal septiembre  | Informe_de_Operación_de_canal_septiembre.pdf  | 03/10/2016    |
| 49 | HITO 48 - Informe de Operación de canal octubre   | INFORME_DE_OPERACIÓN_CANAL_OCTUBRE_2016-1.pdf   | 01/11/2016    |
| 50 | HITO 49 - Informe de Operación de canal noviembre   | Informe_de_operaciones_de_noviembre.pdf   | 02/12/2016    |
| 51 | Hito 5 - Convenio para retransmisión con la operadora DirecTV   | Convenio_para_retransmisión_con_la_operadora_DirecTV.pdf                                      | 03/12/2014    |
| 52 | HITO 50 - Informe anual del proyecto Canal El Ciudadano TV  | Informe_anual_2016.pdf  | 03/01/2017    |
| 53 | HITO 51 - Presupuesto aprobado para el proyecto en el año 2017  | Informe_de_uso_04_Informe_de_Presupuesto_Aprobado.pdf   | 03/02/2017    |
| 54 | HITO 52 - Informe firmado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de enero   | Informe_No._05_Informe_de_Operación_enero.pdf   | 03/02/2017    |
| 55 | HITO 53 - Contratación firmada del servicio de streaming corporativo para TELECIUDADANA                                 | Informe_No._8_CONTRATACIÓN_STREAMING.pdf  | 02/03/2017    |
| 56 | HITO 54 - Informe firmado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de febrero | Informe_No._05_Informe_de_Operación_febrero.pdf   | 02/03/2017    |
| 57 | HITO 55 - Convenio Interinstitucional con CABLEVISIÓN renovado  | Informe_No._13_INFORME_DE_CONVENIO_CABLEVISIÓN_03042017.pdf                                   | 03/04/2017    |
| 58 | hito 56 - Convenio Interinstitucional con ECTV ratificado   | Informe_No._14_INFORME_DE_CONVENIO_ECTV_GPR.pdf   | 03/04/2017    |
| 59 | HITO 57 - Informe firmado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de marzo   | Informe_No._15_Informe_Tx_Estudios_y_Móvil_Marzo.pdf  | 03/04/2017    |
| 60 | HITO 58 - Informe firmado de cumplimiento de metas del proyecto   | Informe_de_cumplimiento_de_meas_del_proyecto.pdf  | 02/05/2017    |
| 61 | HITO 59 - Informe firmado de mantenimiento preventivo de la Unidad Móvil y Grupo electrógeno I Cuatrimestre             | Informe_de_mantenimiento_Unidad_Móvil.pdf   | 02/05/2017    |
| 62 | Hito 6 - (1) Convenio de pago firmado por elaboración de estudios de ingeniería de frecuencias                          | Convenio_de_pago_firmado_por_elaboración_de_estudios_de_ingeniería_de_frecuencias.pdf         | 03/10/2014    |
| 63 | Hito 6 - (2) Convenio de pago firmado por elaboración de estudios de ingeniería de frecuencias                          | Cur_de_pago_del_convenio_firmado_por_elaboración_de_estudios_de_ingeniería_de_frecuencias.pdf | 03/10/2014    |
| 64 | HITO 60 - Informe firmado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de abril   | Informe_de_transmisiones_de_estudios_y_unidad_móvil.pdf                                       | 02/05/2017    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|    | Descripción de Archivo   | Archivo   | Fecha de Alta |
|----|--|---|---------------|
| 65 | HITO 61 - Informe firmado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de mayo       | Informe_de_transmisión_de_estudios_y_unidad_móvil.pdf   | 02/06/2017    |
| 66 | Hito 62 - Informe firmado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de junio      | Informe_No._28_Operación_TELECIUDADANA_Junio.pdf  | 03/07/2017    |
| 67 | HITO 63 - Informe firmado de instalación de repetidoras y cobertura para el proyecto I semestre                            | Informe_No._30_Informe_de_Coberturas_de_TELECIUDADANA.pdf   | 02/08/2017    |
| 68 | HITO 64 - Informe firmado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de julio      | Informe_No._29_Informe_de_Operación_Julio.pdf   | 02/08/2017    |
| 69 | HITO 65 - Informe firmado cuatrimestral de cumplimiento de metas del proyecto  | Informe_No._35_Cumplimiento_de_metas_CTV_II_Cuatrimestre.pdf  | 01/09/2017    |
| 70 | HITO 66 - Informe firmado de mantenimiento preventivo de la Unidad Móvil y Grupo electrógeno II Cuatrimestre               | Informe_No._34_Informe_de_Mantenimiento_de_la_Unidad_Móvil_y_Grupo_electrógeno_II_Cuatrimestre.pdf      | 01/09/2017    |
| 71 | HITO 67 - Informe firmado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de septiembre | Informe_de_Operación_septiembre_CTV.pdf   | 02/10/2017    |
| 72 | HITO 68 - Informe firmado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de octubre    | Informe_No._39_Informe_de_Operación_Octubre.pdf   | 01/11/2017    |
| 73 | Hito 7 - Estudio Financiero elaborado para autorización definitiva   | Formulario-Sostenibilidad-Economica-Publico.xls   | 03/12/2014    |
| 74 | Hito 8 - Informe firmado con TDRs para adquisición estación terrena, MAM, Control Master, Equipamiento estudios            | Informe_firmado_con_TDRs_para_adquisición_estación_terrena_MAM_Control_Master_Equipamiento_estudios.pdf | 03/12/2014    |
| 75 | Hito 81 - Informe de El Ciudadano TV - 2018 Junio  | Informe_de_El_Ciudadano_TV_-_2018_Junio.pdf   | 04/07/2018    |
| 76 | Hito 82 - Transmisiones en vivo - 2018 julio   | Radio-Streaming-Unidad_Movil_-_David_Chavez.pdf   | 06/09/2018    |
| 77 | Hito 83 - Transmisiones en vivo - 2018 agosto  | Transmisiones_en_vivio_-_David_Chávez.pdf   | 06/09/2018    |
| 78 | Hito 9 - Adendum a convenio con ECTV firmado para instalación de 5 repetidoras adicionales                                 | Adendum_a_convenio_con_ECTV_firmado_para_instalación_de_5_repetidoras_adicionales.pdf                   | 05/05/2015    |
| 79 | Hito-1. Solicitud firmada de convenio de pago por estudios de ingeniería de frecuencias                                    | Solicitud_de_convenio_de_pago_estudio_de_ingenieria.pdf   | 04/11/2014    |

**EQUIPO DEL PROYECTO**

| Nombre                        | Rol                | Puesto                                  | Correo Electrónico          | Teléfono(s) |
|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|-------------|
| Arboleda Palma, Jorge Ricardo | Líder del Proyecto | Subsecretario de Medios Institucionales | jorge.arboleda@secom.gob.ec |             |
