

SECOM - Secretaría Nacional de Comunicación
Subsecretaría de Medios Institucionales
Dirección de Contenidos de Medios Institucionales

PROYECTO: K002 Canal 48-49

Líder del Proyecto:	Arboleda Palma, Jorge Ricardo (jorge.arboleda@secom.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Arboleda Palma, Jorge Ricardo	Programas Relacionados:	IMPLEMENTACIÓN DE EL CIUDADANO TV 48 Y 49 CANAL DE TELEVISIÓN DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
Titular:	Novoa Oquendo, Christian Geovanny	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Tecnología	Retorno Económico:	1.38
CUP:	30200000.0000.376396	TIR:	103.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	3,066,122.23
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	6,725,587.78
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2014 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	05/11/2018	Fecha de Fin Base:	31/12/2015
Modificado por:	Arboleda Palma, Jorge Ricardo	Fecha del siguiente Hito:	30/11/2018

DATOS GENERALES

Descripción

Población de referencia: La población total de influencia del proyecto de El Ciudadano TV es todo el Ecuador, según el último censo 2010, 14.483.499 habitantes de los cuales, 7.305.816 son mujeres y 7.177.683 son hombres.
 Población demandante potencial: Considerando que "El Ciudadano TV" cubrirá 47 coberturas a nivel nacional.

La población objetivo son los y las ciudadanas a partir de los 16 años de edad, considerando como las edades que tienen el hábito de ver al menos un programa relacionado al fomento a la participación ciudadana y que promueva la comunicación entre mandantes y mandatario.

Es necesario implementar y diseñar Ciudadano TV como una red pública de comunicación y de servicios a la ciudadanía, que fomente la participación ciudadana y que promueva la comunicación entre mandantes y mandatario. El sistema es más que un medio de comunicación, será además, una herramienta que apoye a la gobernabilidad y que informe permanentemente sobre las actividades del poder ejecutivo; promover valores ciudadanos, culturales, educativos, pero sobre todo, fomentar y fortalecer la democracia. La población total de influencia del proyecto de El Ciudadano TV es todo el Ecuador, hay que considerar que "El Ciudadano TV" cubrirá 47 coberturas a nivel nacional.

Objetivo General

Implementar un sistema de TV en señal abierta de la Función Ejecutiva como parte de la propuesta de comunicación gubernamental: Canal público "El Ciudadano TV".

Objetivos Específicos

- C1. Establecer las condiciones necesarias para una transmisión inmediata del canal público "El Ciudadano TV". Fase 1.
- C2. Operar el canal público "El Ciudadano TV" en frecuencia 48 y 49 UHF a nivel nacional con Infraestructura y equipamiento propios. Fase 2

Beneficios Cualitativos

Contribuir al fortalecimiento democrático del país en su perspectiva del Buen Vivir, transparentando el trabajo de la Función Ejecutiva, auspiciando el debate, la educación y participación ciudadana .

Después de culminado el proyecto, se incrementará en un 10% a nivel nacional el conocimiento de la institucionalidad y actividades que lleva el gobierno en beneficio de sus mandantes.

Tipo de Beneficiario

Externo caracterizado por la población objetivo son los y las ciudadanas a partir de los 16 años de edad, considerando como las edades que tienen el hábito de ver al menos un programa relacionado al fomento a la participación ciudadana y que promueva la comunicación entre mandantes y mandatario.


Restricciones

TIEMPO: 24 MESES
 COSTO: \$ 6.530.413,14
 ALCANCE: NACIONAL
 RECURSOS: TECNOLÓGICOS, MATERIALES Y HUMANO

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 96.93 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2014 Fecha de Fin: 31/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

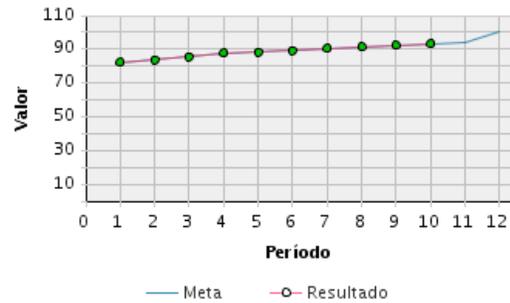

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	82 %	84 %	85 %	88 %	88 %	89 %	91 %	92 %	93 %	93 %	94 %	100 %
	Avance real acumulado											
	82 %	84 %	85 %	88 %	88 %	89 %	91 %	92 %	93 %	93 %		
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Octubre 2018:</p> <p>En cumplimiento de los objetivos institucionales tanto del Proyecto Implementación de El Ciudadano TV 48,49, canal de televisión de la Función Ejecutiva, durante este mes se cumplieron las actividades regulares que a nivel informativo corresponden a estos medios públicos oficiales.</p> <p>Como está establecido en la estructura vigente de estos medios, la mayor parte de los esfuerzos se destina a cumplir con labores informativas, a través de diferentes espacios diseñados para este objetivo. Las transmisiones de las actividades del Señor Presidente de la República del Ecuador, de la Señora Vicepresidenta y de otros altos dignatarios del Gobierno son un producto recurrente de nuestros medios de comunicación que presta un servicio que aprovechan, sobre todo y con mayor realce, los medios de comunicación con menos recursos que se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional. Es así, que cumplimos con la labor de difundir el trabajo de los estamentos de la Función Ejecutiva que por mandato institucional nos corresponde.</p> <p>Se realizaron las siguientes transmisiones en vivo realizadas por el personal de la unidad móvil y streaming:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Imposición de la Orden Nacional al Mérito en el Grado de Gran Collar al Emir de Catar. 2) Rueda de prensa sobre los "Avances en la Ley de Fomento Productivo y proyectos de cooperación con PNUD". 3) Reunión con rectores de universidades y escuelas politécnicas del Ecuador. 4) Lanzamiento del Concurso Público del Proyecto Viaducto Sur en Guayaquil 5) Firma de contratos procesos OIL & Gas y contratos modificatorios Shushufindi y Pardaliservices con presencia del Sr Presidente de la República. 6) Inauguración del centro de salud tipo C en Ciudad Victoria en Guayaquil. 7) Sesión Solemne por las fiestas de independencia de Guayaquil. 8) Rueda de prensa de la presentación del proyecto turístico Tren Playero. 	Arboleda Palma, Jorge Ricardo	05/11/2018 - 11:13 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>9) Presentación del nuevo plan gubernamental de financiamiento "Crédito, inversión y empleo" para la prosperidad. 10) Visita a la empresa de productos biodegradables, Biofábric. 11) Encuentro con nuevos beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. 12) Encuentro del Señor Presidente con organizaciones sociales. 13) Evento: Construimos Empleo y Prosperidad. 14) Rueda de prensa de los Ministerios de Justicia, Interior y Comunicación sobre el caso Alvarado. 15) Ceremonia militar en conmemoración de los 98 años de creación de la Aviación Militar y Día de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. 16) Llegada al aeropuerto de Tababela del Presidente de Perú. 17) Ingreso al Palacio de Carondelet y honores de recibimiento al Presidente Constitucional de la República del Perú y la primera dama. 18) Entrega de la Orden Nacional al mérito en el grado de Gran Collar al Presidente Constitucional de la República del Perú y Ceremonia de conmemoración de la firma de los 20 años del tratado de paz de Brasilia. 19) Despedida al Presidente Constitucional de la República del Perú y su comitiva oficial, en Presidencia. 20) Saludo de bienvenida al Presidente de la República del Perú e Inauguración del XII Gabinete Binacional. 21) Ceremonia de Suscripción de la Declaración Presidencial y Declaración de Prensa 22) Despedida al Presidente de la República del Perú y su comitiva oficial, en Ministerio de Relaciones Exteriores. 23) Salida del aeropuerto de Tababela del Presidente de la República del Perú. 24) Convocatoria a concurso público, de la rehabilitación y ampliación de los tramos viales Santo Domingo-Buena Fe y Buena Fe- Babahoyo-Jujan.</p> <p>Así como grabaciones en en exteriores solicitadas por el área de producción de acuerdo al siguiente detalle: 1) Grabación: Recibimiento con honores al Emir de Catar Jeque Tamim Bin Hamad al Thani. 2) Circuito Cerrado: Presentación de la tercera edición del libro Nueva Historia del Ecuador.</p>		
<p>Septiembre 2018:</p> <p>En cumplimiento de los objetivos institucionales tanto del Proyecto Implementación de El Ciudadano TV 48,49, canal de televisión de la Función Ejecutiva, durante este mes se cumplieron las actividades regulares que a nivel informativo corresponden a estos medios públicos oficiales.</p> <p>Como está establecido en la estructura vigente de estos medios, la mayor parte de los esfuerzos se destina a cumplir con labores informativas, a través de diferentes espacios diseñados para este objetivo. Las transmisiones de las actividades del Señor Presidente de la República del Ecuador, de la Señora Vicepresidenta y de otros altos dignatarios del Gobierno son un producto recurrente de nuestros medios de comunicación que presta un servicio que aprovechan, sobre todo y con mayor realce, los medios de comunicación con menos recursos que se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional. Es así, que cumplimos con la labor de difundir el trabajo de los estamentos de la Función Ejecutiva que por mandato institucional nos corresponde.</p> <p>Se realizaron las siguientes transmisiones en vivo realizadas por el personal de la unidad móvil y streaming: 1) Encuentro del presidente Lenin Moreno con docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional Pablo Muñoz Vega. 2) Reunión del presidente Lenin Moreno con Delegación de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP). 3) Firma del convenio con la conferencia Episcopal Ecuatoriana para la formación técnica y tecnológica. 4) Inauguración de la Feria Internacional Expo Flor Ecuador 2018.</p>	<p>Arboleda Palma, Jorge Ricardo</p>	<p>05/11/2018 - 10:51 AM</p>
<p>Agosto 2018:</p> <p>En cumplimiento de los objetivos institucionales tanto del Proyecto Implementación de El Ciudadano TV 48,49, canal de televisión de la Función Ejecutiva, durante este mes se cumplieron las actividades regulares que a nivel informativo corresponden a estos medios públicos oficiales.</p> <p>Como está establecido en la estructura vigente de estos medios, la mayor parte de los esfuerzos se destina a cumplir con labores informativas, a través de diferentes espacios diseñados para este objetivo. Las transmisiones de las actividades del Señor Presidente de la República del Ecuador, de la Señora Vicepresidenta y de otros altos dignatarios del Gobierno son un producto recurrente de nuestros medios de comunicación que presta un servicio que aprovechan, sobre</p>	<p>Arboleda Palma, Jorge Ricardo</p>	<p>06/09/2018 - 11:02 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>todo y con mayor realce, los medios de comunicación con menos recursos que se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional. Es así, que cumplimos con la labor de difundir el trabajo de los estamentos de la Función Ejecutiva que por mandato institucional nos corresponde.</p> <p>Se realizaron las siguientes transmisiones en vivo realizadas por el personal de la unidad móvil y streaming en el mes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inauguración de la exposición "Artesano - Artista: Tradición y creación" 2. Rueda de prensa tras la reunión del Señor Presidente con los representantes del BID 3. Salida del Presidente de la República a Bogotá desde el Aeropuerto Mariscal Sucre 4. Llegada y palabras del Presidente de la República del Ecuador, a su arribo a Bogotá, Colombia. 5. Ceremonia Militar en conmemoración de los 209 años del Primer Grito de Independencia 6. Entrega oficial del Premio Nacional Eugenio Espejo, en conmemoración del Día Nacional de la Cultura 7. Rueda de Prensa del MTOP sobre las disposiciones del Presidente de la República en relación al accidente de tránsito ocurrido en horas de la madrugada 8. Entrega de resultados del examen nacional de evaluación Ser Bachiller 9. Ceremonia de Entrega de la fase Jacinta Sandiford del Parque Samanes 10. Rueda de prensa sobre las decisiones económicas adoptadas por el Gobierno Nacional 11. Participación del Primer Mandatario en el evento de fortalecimiento del proyecto "Pacto por el Empleo Juvenil". 12. Rueda de prensa sobre la situación de los ciudadanos venezolanos en el Ecuador 13. Encuentro por los 50 años del Seguro Social Campesino 14. Inauguración de la XXIV Feria Internacional Quito Construcción 2018 15. Firma del Acuerdo Ministerial que asegura el pago por compensación jubilar al sector público 16. Promoción de estudiantes de la Fase 1, campaña Todos ABC Monseñor Leonidas Proaño <p>Adicionalmente, la unidad móvil, de acuerdo a las necesidades institucionales, realizó dos grabaciones en exteriores solicitadas por el área de producción de acuerdo al siguiente detalle:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reunión con migrantes venezolanos. 2. Grabación de entrevistas a migrantes venezolanos. 		
<p>Julio 2018:</p> <p>En cumplimiento de los objetivos institucionales tanto del Proyecto Implementación de El Ciudadano TV 48,49, canal de televisión de la Función Ejecutiva, durante este mes se cumplieron las actividades regulares que a nivel informativo corresponden a estos medios públicos oficiales.</p> <p>Como está establecido en la estructura vigente de estos medios, la mayor parte de los esfuerzos se destina a cumplir con labores informativas, a través de diferentes espacios diseñados para este objetivo. Las transmisiones de las actividades del Señor Presidente de la República del Ecuador, de la Señora Vicepresidenta y de otros altos dignatarios del Gobierno son un producto recurrente de nuestros medios de comunicación que presta un servicio que aprovechan, sobre todo y con mayor realce, los medios de comunicación con menos recursos que se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional. Es así, que cumplimos con la labor de difundir el trabajo de los estamentos de la Función Ejecutiva que por mandato institucional nos corresponde.</p> <p>Se realizaron las siguientes transmisiones en vivo realizadas por el personal de la unidad móvil y streaming en el mes de julio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesión solemne por el 51 aniversario de la cantonización Santo Domingo. 2. Firma del Decreto para la creación de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. 3. Encuentro Ciudadano con las brigadistas de la Misión Manuela Espejo. 4. Rueda de Prensa desde SECOM sobre las estadísticas de desempleo y pobreza en el Ecuador. 5. Foro construyendo igualdad desde la Universidad Simón Bolívar Quito. 6. Rueda de Prensa de la Señora Ministra de Justicia, Secretario de Comunicación y Representantes de CIDH. 7. Feria de presentación del programa "Impulso Joven". <p>Adicionalmente, la unidad móvil, de acuerdo a las necesidades institucionales, realizó dos grabaciones en exteriores solicitadas por el área de producción de acuerdo al siguiente detalle:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Grabación de programa Dialogamos con Lenin en el Instituto Tecnológico Tsáchila 2. Minga Agropecuaria, entrega de títulos y créditos productivos. 	<p>Arboleda Palma, Jorge Ricardo</p>	<p>06/08/2018 - 07:01 PM</p>
<p>1.ANTECEDENTES</p> <p>De acuerdo a las necesidades de la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM), la Subsecretaría de Medios Institucionales realiza transmisiones en vivo de la agenda de actividades de la Función Ejecutiva, así como de eventos de interés nacional, en este contexto se</p>	<p>Vallejo Villacres, Elizabeth Andrea</p>	<p>04/07/2018 - 09:35 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización																		
<p>traslada personal técnico y periodístico hacia los diferentes sitios donde se requiera realizar las transmisiones.</p> <p>La realización de una transmisión en vivo es dispuesta por las autoridades de la SECOM. Una vez que se cuenta con la disposición de una transmisión, se trabaja coordinadamente con diferentes áreas de la institución a fin de llevar a cabo las tareas requeridas.</p> <p>La señal generada en exteriores se recibe en los estudios para posteriormente ser emitida al aire a través de las estaciones transmisoras y las diferentes plataformas digitales (streaming, página web, app).</p> <p>2.CONTENIDO/ANÁLISIS TÉCNICO</p> <p>Con el fin de que la ciudadanía conozca de primera mano y de manera oportuna acerca de las acciones y gestiones emprendidas por el Gobierno Nacional en favor de los mandantes, en el mes de junio de 2018 se han realizado seis transmisiones en vivo, cuatro de éstas corresponden a eventos donde ha intervenido el Señor Presidente de la República y eventos de interés nacional organizados por estamentos de la Función Ejecutiva.</p> <p>En la siguiente tabla se refleja el detalle de las transmisiones realizadas en junio a través de la Unidad Móvil:</p> <table border="0"> <tr> <td>No.Fecha</td> <td>Evento</td> <td>Medio</td> </tr> <tr> <td>Responsible del Evento</td> <td>Técnico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>17-June-18</td> <td>Grabación de programa: Dialogamos con Lenín en el Parque Cumandá</td> <td>PRESIDENCIA - SECOM</td> </tr> <tr> <td>Nelson López</td> <td>Unidad Móvil - Grabación</td> <td></td> </tr> <tr> <td>212-June-18</td> <td>Grabación de programa: Dialogamos con Lenín en la UEM del Tena</td> <td>PRESIDENCIA - SECOM</td> </tr> <tr> <td>Nelson López</td> <td>Unidad Móvil - Grabación</td> <td></td> </tr> </table>	No.Fecha	Evento	Medio	Responsible del Evento	Técnico		17-June-18	Grabación de programa: Dialogamos con Lenín en el Parque Cumandá	PRESIDENCIA - SECOM	Nelson López	Unidad Móvil - Grabación		212-June-18	Grabación de programa: Dialogamos con Lenín en la UEM del Tena	PRESIDENCIA - SECOM	Nelson López	Unidad Móvil - Grabación			
No.Fecha	Evento	Medio																		
Responsible del Evento	Técnico																			
17-June-18	Grabación de programa: Dialogamos con Lenín en el Parque Cumandá	PRESIDENCIA - SECOM																		
Nelson López	Unidad Móvil - Grabación																			
212-June-18	Grabación de programa: Dialogamos con Lenín en la UEM del Tena	PRESIDENCIA - SECOM																		
Nelson López	Unidad Móvil - Grabación																			
<p>Mayo 2018:</p> <p>En cumplimiento de los objetivos institucionales tanto del Proyecto Implementación de El Ciudadano TV 48,49, canal de televisión de la Función Ejecutiva, durante el mes de mayo del presente año se cumplieron las actividades regulares que a nivel informativo corresponden a estos medios públicos oficiales.</p> <p>Como está establecido en la estructura vigente de estos medios, la mayor parte de los esfuerzos se destina a cumplir con labores informativas, a través de diferentes espacios diseñados para este objetivo. Las transmisiones de las actividades del Señor Presidente de la República del Ecuador, de la Señora Vicepresidenta y de otros altos dignatarios del Gobierno son un producto recurrente de nuestros medios de comunicación que presta un servicio que aprovechan, sobre todo y con mayor realce, los medios de comunicación con menos recursos que se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional. Es así, que cumplimos con la labor de difundir el trabajo de los estamentos de la Función Ejecutiva que por mandato institucional nos corresponde.</p> <p>En mayo el área técnica operativa ha realizado, además de las funciones propias que permiten garantizar la operatividad de los medios de comunicación, los procesos faltantes de registro público de medios y rendición de cuentas antes el CORDICOM, dando cumplimiento a la normativa regulatoria vigente.</p> <p>Otras actividades administrativas desarrolladas son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> .Se solicitó cotizaciones para valorar posibilidades de traslado y/o funcionamiento de equipos de control master que permita emitir la señal 24/7 de El Ciudadano TV. .Se desarrollaron actividades de elaboración de informes para avanzar con el proceso de mantenimiento de la unidad móvil. .Se coordinó y realizó el mantenimiento de los equipos de transmisión portátil livestreaming. .Se desarrolló una alternativa de utilización del equipo de emisión de señal sin costo para la SECOM a fin de emitir la señal de El Ciudadano Tv desde sus propias oficinas. <p>En el Ciudadano Tv se realizaron las siguientes transmisiones de la Función Ejecutiva:</p> <p>Posesión de nuevos ministros Informe a la Nación Primer año de Gobierno</p> <p>Tipo de TransmisiónNúmero Unidad móvil2 Equipo streaming0</p>	<p>Vallejo Villacres, Elizabeth Andrea</p>	<p>04/07/2018 - 09:11 AM</p>																		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>TOTAL2</p> <p>Informe de Gestión del Proyecto de Rehabilitación Radio Ciudadana y del Proyecto Implementación de El Ciudadano TV 48,49, canal de televisión de la Función Ejecutiva</p> <p>ABRIL DEL 2018</p> <p>Como está establecido en la estructura vigente de estos medios, la mayor parte de los esfuerzos se destina a cumplir con labores informativas, a través de diferentes espacios diseñados para este objetivo. Las transmisiones de las actividades del Señor Presidente de la República del Ecuador, de la Señora Vicepresidenta y de otros altos dignatarios del Gobierno son un producto recurrente de nuestros medios de comunicación que presta un servicio que aprovechan, sobre todo y con mayor realce, los medios de comunicación con menos recursos que se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional. Es así, que cumplimos con la labor de difundir el trabajo de los estamentos de la Función Ejecutiva que por mandato institucional nos corresponde.</p> <p>Durante abril se realizaron 8 transmisiones por El Ciudadano Tv, 12 por radio La Ciudadana, 20 productos gráficos, 86 programas radiales, 368 fotografías, 20 galería fotográficas, 4 El Presidente Informa, 112 productos audiovisuales (insumos para la cadena nacional), 58 coberturas de las actividades del Presidente de la República y de interés presidencial, 9 producciones gráficas para la cadena, 9 vídeos para otras instituciones públicas, 5 cuñas radiales para otras instituciones públicas, 5 locuciones para la Vicepresidencia de la República, 32 infochannels, 814 micro informativos, 3 coberturas y 4 transmisiones a través de nuestros medios.</p>	<p>Khalife Moraga, Galo Miguel</p>	<p>07/05/2018 - 08:52 AM</p>
<p>Enero-Marzo 2018</p> <p>RESUMEN EJECUTIVO</p> <p>Informe de Gestión del Proyecto de Rehabilitación Radio Ciudadana y del Proyecto Implementación de El Ciudadano TV 48,49, canal de televisión de la Función Ejecutiva ENERO DE 2018</p> <p>Como está establecido en la estructura vigente de estos medios, la mayor parte de los esfuerzos se destina a cumplir con labores informativas, a través de diferentes espacios diseñados para este objetivo. Las transmisiones de las actividades del Señor Presidente de la República del Ecuador, de la Señora Vicepresidenta y de otros altos dignatarios del Gobierno son un producto recurrente de nuestros medios de comunicación que presta un servicio que aprovechan, sobre todo y con mayor realce, los medios de comunicación con menos recursos que se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional. Es así, que cumplimos con la labor de difundir el trabajo de los estamentos de la Función Ejecutiva que por mandato institucional nos corresponde.</p> <p>Se realizaron 23 transmisiones en El Ciudadano Tv y 20 en radio La Ciudadana.</p> <p>FEBRERO DE 2018</p> <p>En cumplimiento al mandato institucional que nos corresponde y acorde a lo establecido en la estructura vigente de los mencionados medios públicos oficiales, gran parte del trabajo realizado acorde a las necesidades y requerimientos de la Función Ejecutiva se han encaminado a las labores informativas desde distintos espacios. Las transmisiones de las actividades del Señor Presidente de la República del Ecuador, de la Señora Vicepresidenta y de otros altos dignatarios del Gobierno son un producto permanente de los medios de comunicación oficiales para además de transmitir directamente a la ciudadanía, se proporciona información oficial de la Función Ejecutiva a los medios de comunicación con menos recursos que se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional y no cuentan con la capacidad técnica ni operativa para cubrir todos los acontecimientos de la coyuntura nacional.</p> <p>Se realizaron 7 transmisiones en El Ciudadano Tv y 11 en radio La Ciudadana.</p> <p>MARZO DE 2018</p> <p>Además de cumplir con las transmisiones de las actividades del Señor Presidente de la República del Ecuador, de la Señora Vicepresidenta y de otros altos dignatarios del Gobierno, se realizó el mantenimiento preventivo del equipamiento de la cabina de la cabina principal de Radio Ciudadana y del equipamiento de radiofrecuencia del transmisor FM que cubre la ciudad de Quito y sus alrededores, en este mantenimiento se capacitó al personal del área técnica para un soporte de primer nivel.</p>	<p>Khalife Moraga, Galo Miguel</p>	<p>07/05/2018 - 08:52 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se realizaron 9 transmisiones en El Ciudadano Tv y 3 en radio La Ciudadana.		
DICIEMBRE 2017 - Se realizó mantenimiento mecánico del vehículo Unidad Móvil , se realizaron transmisiones en vivo de las actividades del Sr. Presidente con previas, entrevistas, vocerías desde territorio a fin de informar de forma verás a la ciudadanía.	Khalife Moraga, Galo Miguel	04/01/2018 - 02:46 PM
NOVIEMBRE 2017 - Se inició el proceso de compra de equipamiento para repotenciar la unidad móvil y el master del canal, así como todas las transmisiones desde territorio del presente mes fueron realizadas con la unidad móvil de SECOM. Adicionalmente se realizaron transmisiones en vivo de las actividades del Sr. Presidente con previas, entrevistas, vocerías desde territorio a fin de informar de forma verás a la ciudadanía.	Acaro Vega, Christian Fernando	01/12/2017 - 09:22 AM
OCTUBRE 2017 - Se repotenció la unidad móvil a través de la adquisición de nuevo cableado para las cámaras y se reconectorizó las conexiones para garantizar las transmisiones. Adicionalmente se realizaron transmisiones en vivo de las actividades del Sr. Presidente con previas, entrevistas, vocerías desde territorio a fin de informar de forma verás a la ciudadanía.	Acaro Vega, Christian Fernando	01/11/2017 - 12:52 PM
SEPTIEMBRE 2017 - Se realizaron transmisiones de las actividades del señor Presidente con el nuevo equipo portátil, lo que ocasionó reducción de recurso en cuanto a movilización de personal a territorio. Adicionalmente se realizaron transmisiones en vivo de las actividades del Sr. Presidente con previas, entrevistas, vocerías desde territorio a fin de informar de forma verás a la ciudadanía.	Acaro Vega, Christian Fernando	02/10/2017 - 03:02 PM
AGOSTO 2017 - Se solicitó la autorización definitiva por 15 años de las 47 frecuencias a nivel nacional, así como se realizó el mantenimiento preventivo de la Unidad Móvil. Adicionalmente se realizaron transmisiones en vivo de las actividades del Sr. Presidente con previas, entrevistas, vocerías desde territorio a fin de informar de forma verás a la ciudadanía.	Acaro Vega, Christian Fernando	01/09/2017 - 03:05 PM
JULIO 2017 - Se realiza transmisión en vivo de las 3 emisiones del noticiero, se están realizando nuevos programas desde territorio como son: Gobierno para Todos y Construyendo Igualdad y se puso en funcionamiento el equipo profesional para el streaming 24/7 y el nuevo equipo portátil para grabaciones y transmisiones. Adicionalmente se realizaron transmisiones en vivo de las actividades del Sr. Presidente con previas, entrevistas, vocerías desde territorio a fin de informar de forma verás a la ciudadanía.	Acaro Vega, Christian Fernando	02/08/2017 - 01:04 PM
JUNIO 2017 - Se puso en funcionamiento el nuevo enlace de conexión entre los estudios (GAMA TV) y la estación terrena de transmisión (ECTV), así como se realizó la recepción del equipo profesional para el streaming 24/7 y del nuevo equipo portátil para grabaciones y transmisiones. Adicionalmente, se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes.	Acaro Vega, Christian Fernando	03/07/2017 - 10:53 AM
MAYO 2017 - Se realizó las pruebas respectivas para tener un nuevo enlace de conexión entre los estudios (GAMA TV) y la estación terrena de transmisión (ECTV). Adicionalmente, se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes.	Acaro Vega, Christian Fernando	02/06/2017 - 02:45 PM
ABRIL 2017 - Se logró suscribir el convenio con ECTV y se han realizado transmisiones locales utilizando un nuevo sistema de streaming con lo que se ha podido salir con reportero desde territorio durante las previas de las transmisiones. Adicionalmente, se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes.	Acaro Vega, Christian Fernando	02/05/2017 - 04:11 PM
MARZO 2017 - Se logró suscribir el convenio con CABLEVISIÓN y el convenio con ECTV se encuentra en la etapa final, permitiendo continuar con la operatividad del canal. Adicionalmente, se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes.	Acaro Vega, Christian Fernando	03/04/2017 - 04:36 PM
FEBRERO 2017 - Se ha implementado un nuevo programa de entrevistas luego de cada transmisión en vivo, en el cual analistas y ciudadanos conforman un panel para comprender la magnitud de la obra inaugurada y el servicio que prestará a la ciudadanía. Adicionalmente, se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes.	Acaro Vega, Christian Fernando	02/03/2017 - 04:27 PM
FEBRERO 2017 - Se encuentra instalados los equipos de las estaciones repetidoras de radio Ciudadana FM en las ciudades de Quito, Guayaquil, Loja, Cuenca, Manta y Portoviejo. Adicionalmente se realizaron transmisiones en vivo de las actividades del Sr. Presidente con previas, entrevistas, vocerías desde territorio a fin de informar de forma verás a la ciudadanía	Acaro Vega, Christian Fernando	02/03/2017 - 04:18 PM
ENERO 2017 - Se cuenta con el presupuesto aprobado para la operación del canal el presente año, así como por primera vez se realizaron transmisiones de todas las actividades del señor Presidente desde Italia y España utilizando la tecnología streaming con calidad broadcasting. Adicionalmente, se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes.	Acaro Vega, Christian Fernando	03/02/2017 - 01:01 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
DICIEMBRE 2016 - Se realizó la instalación de dos nuevas repetidoras en las ciudades de Tena y Puyo, por lo que se tiene un total de 45 repetidoras operando a nivel nacional. Adicionalmente, se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes.	Acaro Vega, Christian Fernando	03/01/2017 - 03:28 PM
NOVIEMBRE 2016 - Se realizó una transmisión simultánea de tres eventos: Coca Codo Sinclair, inicio de construcción del Hospital de Chone afectado por el terremoto y desde el ECU 911 donde se encontraban los presidentes de Ecuador y China, así como se transmitió en vivo los noticieros vespertino y nocturno y un programa especial desde Loja por el tema del Festival de las Artes Vivas. Adicionalmente, se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes.	Acaro Vega, Christian Fernando	02/12/2016 - 10:00 AM
OCTUBRE 2016 - Se cuenta con las autorizaciones respectivas para la instalación de dos repetidoras adicionales en el oriente ecuatoriano (Tena y Macas), mismas que se tiene previstas que hasta finales del mes de noviembre se encuentren operativas. Adicionalmente, se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes.	Acaro Vega, Christian Fernando	01/11/2016 - 11:49 AM
SEPTIEMBRE 2016 - Actualmente se cuenta con streaming permanente 24/7 de la nueva programación del canal y se consensuó con PETROECUADOR las condiciones del convenio para realizar mejoras en la cacteta del Cerro Pichincha donde están instalados nuestros equipos de transmisión. Adicionalmente, se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes.	Acaro Vega, Christian Fernando	03/10/2016 - 01:24 PM
AGOSTO 2016 - Desde el lunes 15 de agosto se lanzó la nueva línea grafica del canal, el cambio de nombre de Ciudadano Tv a TeleCiudadana, la nueva parrilla de programación y el Noticiero Ciudadano en sus 3 emisiones 07h00, 13h00 y 19h00. Adicionalmente, se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes.	Acaro Vega, Christian Fernando	02/09/2016 - 11:07 AM
JULIO 2016 - Durante el mes se ha lanzado el proceso para la contratación del servicio de streaming profesional para las transmisiones de las actividades de Presidencia, adicionalmente se ha contratado el alquiler de equipo de audio y video para optimizar el uso de señales y grabación para el noticiero del canal. Por otra parte se adecuó el equipo técnico para realizar emisiones en tiempo real utilizando la nueva plataforma en tiempo real de streaming Facebook Live. Finalmente se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes, que suman 17.	Acaro Vega, Christian Fernando	02/08/2016 - 03:46 PM
JUNIO 2016 - Durante el mes se ha finalizado las adecuaciones técnicas para poder unificar los 2 controles másteres a fin de optimizar el recurso humano del canal y se suscribió el convenio interinstitucional con CABLEVISIÓN para contar con el equipamiento para operar el canal. Adicionalmente se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes, que suman 25.	Acaro Vega, Christian Fernando	01/07/2016 - 03:23 PM
MAYO 2016 - Durante el mes de mayo se realizaron las adecuaciones técnicas para poder transmitir la nueva parrilla de programación y el nuevo informativo que se transmitirá a las 07h00 y 19h00. Adicionalmente se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes de abril, que en total suman 24.	Acaro Vega, Christian Fernando	03/06/2016 - 10:01 AM
ABRIL 2016 - Durante el mes de abril se realizaron los trámites respectivos para viabilizar la contratación del streaming que se publica en las páginas oficiales de Presidencia y El Ciudadano, así como para el convenio que se mantiene suscrito con ECUADOR TV para la operación del canal. Adicionalmente se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes de abril, que en total suman 30.	Acaro Vega, Christian Fernando	03/05/2016 - 02:54 PM
MARZO 2016 - Durante el mes de marzo se realizaron las solicitudes de validación por parte del Ministerio de Finanzas de acuerdo a la nueva reglamentación vigente, a fin de iniciar los procesos de contratación respectivos. Adicionalmente se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes de febrero, que suman 32 transmisiones al mes.	Acaro Vega, Christian Fernando	04/04/2016 - 04:15 PM
FEBRERO 2016 - Durante el mes de febrero se realizaron las validaciones de todos los rubros contemplados en el PAI, obteniendo la aprobación del presupuesto, con el detalle de todos los rubros que serán ejecutados para el año 2016.	Acaro Vega, Christian Fernando	16/03/2016 - 10:48 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Adicionalmente se realizaron las transmisiones en vivo y en diferido de todas las actividades del señor Presidente, así como especiales realizados dentro del proyecto durante el mes de febrero, que suman 30 transmisiones al mes. Para conseguir estos objetivos, los recursos del proyecto fueron organizados para cumplir con las tareas establecidas en los aspectos administrativos, técnicos y operativos		
ENERO 2016. Durante este mes se realizó la planificación del cumplimiento de metas del proyecto de forma concomitante con el presupuesto disponible y los objetivos propios del proyecto, por lo que dicha planificación se plasma en el listado de hitos a cumplirse durante el 2016	Acaro Vega, Christian Fernando	15/02/2016 - 03:29 PM
DICIEMBRE 2015: En el área de operaciones, se han cumplido con todas las transmisiones requeridas por parte de Presidencia y las actividades propias de SECOM, realizándose en el año 293 transmisiones con un total de 432 horas al aire. Adicionalmente, en el streaming que se publica en las páginas web de Presidencia y El Ciudadano, así como el de You Tube se sobrepasó el millón de visualizaciones.	Acaro Vega, Christian Fernando	04/01/2016 - 03:31 PM
NOVIEMBRE 2015: En el área de operaciones, se han cumplido con todas las transmisiones requeridas por parte de Presidencia y las actividades propias de SECOM. Adicionalmente, se realizó una migración del satélite por pedido del proveedor internacional y en todas las repetidoras y sistema de audio y video se realizaron los cambios de parámetros satelitales.	Acaro Vega, Christian Fernando	04/12/2015 - 02:37 PM
OCTUBRE: En el área de operaciones, se han cumplido con todas las transmisiones requeridas por parte de Presidencia y las actividades propias de SECOM. Adicionalmente, se llevó adelante un proceso de evaluación del personal a fin de mejorar los procesos y optimizar recursos, y se inició el proceso de contratación de spots promocionales relacionados con las enmiendas constitucionales	Acaro Vega, Christian Fernando	05/11/2015 - 03:53 PM
SEPTIEMBRE: En el área de operaciones, se han cumplido con todas las transmisiones requeridas por parte de Presidencia y las actividades propias de SECOM. Adicionalmente se está utilizando un nuevo aplicativo de streaming que permite levantar dicha señal con el uso de un celular y la red de telefonía celular, facilitando de esta manera en caso de alguna emergencia poder obtener una señal básica de streaming.	Acaro Vega, Christian Fernando	05/10/2015 - 02:50 PM
AGOSTO: Durante el mes de agosto, se han efectuado varias actividades relacionadas al ajuste de presupuestos pues debido a las modificaciones presupuestarias dispuestas por la autoridad de Finanzas se dieron recortes en el presupuesto que requirieron los ajustes a nivel de proyecto. Por otra parte en el área de operaciones, se han cumplido con todas las transmisiones requeridas por parte de Presidencia y las actividades propias de SECOM.	Acaro Vega, Christian Fernando	03/09/2015 - 06:11 PM
JUNIO: A la presente fecha el canal ya cuenta con un canal en YouTube el cual sobrepasa los 1000 suscriptores y existen aproximadamente 100000 visualizaciones de los videos que se encuentran publicados. Adicionalmente se han podido cubrir todas las actividades de inauguración de obras del señor Presidente.	Acaro Vega, Christian Fernando	05/08/2015 - 05:54 PM
JULIO: A la presente fecha la unidad móvil de la SECOM ha realizado 50 transmisiones de eventos relacionados con la agenda del señor Presidente y se están transmitiendo los programas de interés general que son producidos en el canal Público "Ecuador Tv". Adicionalmente se han tenido que realizar algunas modificaciones en la ejecución del proyecto, en razón de que existió una reducción en el presupuesto, sin embargo las mismas han sido consideradas para el siguiente año.		
MAYO 2015: A la presente fecha el canal se encuentra generando el streaming de las actividades del señor Presidente que se visualiza en las páginas web de la Presidencia y El Ciudadano. Adicionalmente se ha realizado las gestiones correspondientes a fin de que ciertos programas de interés general que son producidos en el canal Público "Ecuador Tv" sean transmitidos en nuestro canal.	Acaro Vega, Christian Fernando	05/06/2015 - 11:36 AM
ABRIL 2015: La señal del canal ahora se encuentra disponible en nuestro canal YOUTUBE Ciudadano TV y se transmiten las actividades oficiales del señor Presidente de la República, en el próximo mes se tiene planificado tener streaming 24/7/365.	Acaro Vega, Christian Fernando	04/05/2015 - 02:58 PM
MARZO 2015: Al momento el canal cuenta con la unidad móvil para realizar las transmisiones de los eventos del señor Presidente de la República y hasta la presente fecha se han realizado alrededor de 160 transmisiones en vivo correspondiente a alrededor de 250 horas.	Acaro Vega, Christian Fernando	02/04/2015 - 02:20 PM
ENERO 2015: Al momento el canal está incluido en el 51 % de los sistemas de audio y video por suscripción a nivel nacional y se encuentra incluido en 5 de los 6 sistemas DTH (DIRECTV, TV CABLE, UNIVISA, CLARO TV y CNT TV). La programación está siendo modificada de acuerdo a la parrilla aprobada por el señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones, a fin de cumplir con el porcentaje de producción nacional establecida en la Ley Orgánica de Comunicación.	Acaro Vega, Christian Fernando	04/03/2015 - 11:00 AM
FEBRERO 2015: Al momento el canal cuenta con la unidad móvil para realizar las transmisiones de los eventos del señor Presidente de la República y adicionalmente cuenta con el		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
equipo técnico y operativo para poner en funcionamiento la misma. La programación está siendo modificada de acuerdo a la parrilla aprobada por el señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones, a fin de cumplir con el porcentaje de producción nacional establecida en la Ley Orgánica de Comunicación.		
NOVIEMBRE: Estamos transmitiendo noticieros de carácter informativo nacional en la mañana, al medio día y en la noche que la productora local contratada nos entrega y hasta la presente fecha se han realizado alrededor de 100 transmisiones en vivo de eventos del Gobierno Nacional; adicionalmente, nos encontramos 24/7/365 en DIRECTV en el canal 177 DICIEMBRE: Al momento el proyecto cuenta con 43 repetidoras UHF canal 48 y 49 al aire respectivamente, en 20 provincias del país y estamos incluidos en el 38 % de los sistemas de audio y video por suscripción a nivel nacional. La programación está siendo modificada de acuerdo a la parrilla aprobada por el señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones, a fin de cumplir con el porcentaje de producción nacional establecida en la Ley Orgánica de Comunicación.	Acaro Vega, Christian Fernando	05/01/2015 - 03:16 PM
OCTUBRE: Al momento el proyecto cuenta con 43 repetidoras UHF canal 48 y 49 al aire respectivamente, en 20 provincias del país enlazadas vía satélite dese un control master digital calidad SD que ha sido alquilado junto con estudios, cabina de locución, equipo técnico y operativo necesarios para la operación. Se cuenta también con programación de carácter informativo nacional contratada con una productora local; y, a la presente fecha estamos siendo retransmitidos por el 30% de los sistemas de audio y video por suscripción a nivel nacional.	Suárez Callejas, Diego	06/11/2014 - 09:55 AM

Riesgos cerrados: 17, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN: Solicitud firmada de convenio de pago por estudios de ingeniería de frecuencias	3-Adjudicación	14/10/2014		13/10/2014		Sí	0.8
2	EJECUCIÓN: Informe firmado de avance de cobertura en sistemas AVS	5-Entregables Intermedios	17/10/2014		17/10/2014		Sí	1.6
3	EJECUCIÓN: Informe firmado de operación de repetidoras a nivel nacional.	5-Entregables Intermedios	17/10/2014		17/10/2014		Sí	1.6
4	EJECUCIÓN: Contrato suscrito para la adquisición de programación con contenidos nacionales.	4-Inicio de Trabajo	20/10/2014		20/10/2014		Sí	1.6
5	EJECUCIÓN: Convenio para retransmisión con la operadora DirecTV	4-Inicio de Trabajo	17/11/2014		11/11/2014		Sí	0.8
6	EJECUCIÓN: Convenio de pago firmado por elaboración de estudios de ingeniería de frecuencias	4-Inicio de Trabajo	28/11/2014		18/11/2014		Sí	0.8
7	EJECUCIÓN: Estudio Financiero elaborado para autorización definitiva	5-Entregables Intermedios	28/11/2014		28/11/2014		Sí	1.6
8	EJECUCIÓN: Informe firmado con TDRs para adquisición	5-Entregables Intermedios	28/11/2014		28/11/2014		Sí	0.8

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	estación terrena, MAM, Control Master, Equipamiento estudios							
9	EJECUCIÓN: Adendum a convenio con ECTV firmado para instalación de 5 repetidoras adicionales	4-Inicio de Trabajo	15/12/2014		15/12/2014		Sí	0.8
10	EJECUCIÓN: Informe firmado de requerimiento de espacio físico para instalación de estudios, control master, control técnico y estación terrena.	5-Entregables Intermedios	15/12/2014		15/12/2014		Sí	0.8
11	EJECUCIÓN: Informe firmado de avance de instalación de las 5 repetidoras y cobertura sistemas AVS	5-Entregables Intermedios	19/12/2014		19/12/2014		Sí	1.6
12	EJECUCIÓN: Informe firmado de requerimiento de alquiler del control master para el año 2015	5-Entregables Intermedios	19/12/2014		19/12/2014		Sí	0.8
13	EJECUCIÓN: Plan Comunicacional elaborado para la autorización definitiva de frecuencias	5-Entregables Intermedios	23/12/2014		23/12/2014		Sí	1.6
14	EJECUCIÓN: Solicitud de autorización de frecuencias definitiva ingresada a la autoridad de telecomunicaciones	9-Entregables Formales	09/01/2015		09/01/2015		Sí	1.6
15	EJECUCIÓN: Informe firmado de requerimiento de transferencia de fondos por convenio ECTV para el año 2015.	4-Inicio de Trabajo	09/01/2015		09/01/2015		Sí	0.8
16	EJECUCIÓN: Informe firmado con TDRs para consultoría de diseño físico y arquitectónico de estudios.	5-Entregables Intermedios	16/01/2015		16/01/2015		Sí	0.8
17	EJECUCIÓN: Informe firmado con TDRs para consultoría de diseño físico y arquitectónico de estudios	5-Entregables Intermedios	16/02/2015		16/02/2015		Sí	0.8
18	EJECUCIÓN: Informe final firmado de instalación de 5 repetidoras	9-Entregables Formales	20/02/2015		20/02/2015		Sí	1.6
19	EJECUCIÓN: Contrato firmado de alquiler del control Master	4-Inicio de Trabajo	27/02/2015		27/02/2015		Sí	1.6
20	EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción firmada, de consultoría para diseño físico y arquitectónico de estudios.	5-Entregables Intermedios	30/03/2015		30/03/2015		Sí	0.8
21	EJECUCIÓN: Informe firmado de avance de obtención de frecuencias definitivas para El ciudadano TV	5-Entregables Intermedios	30/03/2015		30/03/2015		Sí	0.8
22	EJECUCIÓN: Informe firmado con TDRs para adecuación de espacios físicos y arquitectónicos.	5-Entregables Intermedios	10/04/2015		10/04/2015		Sí	0.8
23	EJECUCIÓN: Resolución de autorización definitiva	9-Entregables Formales	30/04/2015		30/04/2015		Sí	1.6

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de frecuencias emitida por la autoridad de telecomunicaciones							
24	EJECUCIÓN: Informe firmado de avance de los procesos de adquisición del equipamiento para estudios, control master, estación terrena y MAM	5-Entregables Intermedios	29/05/2015		29/05/2015		Sí	0.8
25	EJECUCIÓN: Informe firmado de avance del proceso de contratación de adecuaciones físicas y arquitectónicas de los estudios	5-Entregables Intermedios	29/05/2015		29/05/2015		Sí	0.8
26	EJECUCIÓN: Informe de TDRs para la adquisición de equipamiento para Streaming del Canal	5-Entregables Intermedios	19/06/2015		19/06/2015		Sí	0.8
27	EJECUCIÓN: Informe firmado del avance del proceso de adquisición de equipamiento para Streaming del Canal	9-Entregables Formales	27/07/2015		27/07/2015		Sí	0.8
28	EJECUCIÓN: Informe firmado de TDRs para la adquisición de: SISTEMA PORTÁTIL DE PRODUCCIÓN DE EXTERIORES SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEÑALES DE AUDIO Y VIDEO PROFESIONAL PTP SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AUDIO Y VIDEO PROFESIONAL OFFLINE PARA EL CIUDADANO TV	5-Entregables Intermedios	28/08/2015		28/08/2015		Sí	0.8
29	EJECUCIÓN: Informe de TDRs para la CONTRATACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CÁPSULAS INFORMATIVAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA EL CIUDADANO TV	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	28/09/2015		28/09/2015		Sí	1.6
30	EJECUCIÓN: Informe firmado de avance del proceso de adquisición de equipamiento para los SISTEMAS PORTÁTIL DE PRODUCCIÓN DE EXTERIORES, TRANSMISIÓN DE SEÑALES DE AUDIO Y VIDEO PROFESIONAL PTP Y DE ALMACENAMIENTO DE AUDIO Y VIDEO PROFESIONAL OFFLINE	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	29/10/2015		29/10/2015		Sí	1.6
31	EJECUCIÓN: Informe firmado de avance del proceso de adquisición de equipamiento para la CONTRATACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CÁPSULAS INFORMATIVAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA EL CIUDADANO TV	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	27/11/2015		27/11/2015		Sí	1.6
32	EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción firmada del alquiler del control master	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	11/12/2015		11/12/2015		Sí	1.6

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
33	EJECUCIÓN: Actas de entrega recepción firmada de CONTRATACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CÁPSULAS INFORMATIVAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA EL CIUDADANO TV	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	23/12/2015		23/12/2015		Sí	1.6
34	EJECUCIÓN: Actas de entrega recepción firmada de CONTROL MASTER DE STREAMING PARA MÚLTIPLES SEÑALES SD/ HD SISTEMA PORTÁTIL DE PRODUCCIÓN DE EXTERIORES Y SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEÑALES DE AUDIO Y VIDEO PROFESIONAL PTP	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	23/12/2015		23/12/2015		Sí	1.6
35	CIERRE: Informes final firmado de la implementación del proyecto "El Ciudadano TV"	V - Verificación ejecutiva	29/12/2015		29/12/2015		Sí	0.8
36	EJECUCIÓN: Informe de Planificación 2016	5-Entregables Intermedios	31/01/2016		31/01/2016		Sí	0.8
37	EJECUCIÓN: TDR´s de Alquiler equipos del control Master	5-Entregables Intermedios	22/02/2016		22/02/2016		Sí	1.6
38	EJECUCIÓN: Producción de pastillas informativas para radio contratadas	5-Entregables Intermedios	14/03/2016		14/03/2016		Sí	1.6
39	EJECUCIÓN: Borrador de Convenio con Ecuador TV elaborado	5-Entregables Intermedios	20/03/2016		20/03/2016		Sí	0.8
40	EJECUCIÓN: TDR's de streaming elaborado	5-Entregables Intermedios	30/03/2016		30/03/2016		Sí	1.6
41	EJECUCIÓN: Convenio con Ecuador TV aprobado y firmado	5-Entregables Intermedios	11/04/2016		11/04/2016		Sí	1.6
42	EJECUCIÓN: Servicio de streaming contratado	5-Entregables Intermedios	15/04/2016		15/04/2016		Sí	1.6
43	EJECUCIÓN: Informe de Operación de canal mayo	5-Entregables Intermedios	20/05/2016		20/05/2016		Sí	1.6
44	EJECUCIÓN: Informe de Operación de canal junio	5-Entregables Intermedios	24/06/2016		24/06/2016		Sí	1.6
45	EJECUCIÓN: Informe de Operación de canal julio	5-Entregables Intermedios	24/07/2016		24/07/2016		Sí	0.8
46	EJECUCIÓN: Informe de Operación de canal agosto	5-Entregables Intermedios	30/08/2016		30/08/2016		Sí	0.8
47	EJECUCIÓN: Informe de Operación de canal septiembre	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		30/09/2016		Sí	0.8
48	EJECUCIÓN: Informe de Operación de canal octubre	5-Entregables Intermedios	30/10/2016		30/10/2016		Sí	0.8
49	EJECUCIÓN: Informe de Operación de canal noviembre	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		30/11/2016		Sí	0.8
50	EJECUCIÓN: Informe anual del proyecto Canal El Ciudadano TV	9-Entregables Formales	30/12/2016		30/12/2016		Sí	1.6
51	EJECUCIÓN: Presupuesto aprobado para el proyecto en el año 2017	5-Entregables Intermedios	30/01/2017		30/01/2017		Sí	1.6

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
52	EJECUCIÓN: Informe firmado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de enero	5-Entregables Intermedios	31/01/2017		31/01/2017		Sí	0.8
53	EJECUCIÓN: Contratación firmada del servicio de streaming corporativo para TELECIUDADANA	5-Entregables Intermedios	28/02/2017		28/02/2017		Sí	0.8
54	EJECUCIÓN: Informe firmado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de febrero	5-Entregables Intermedios	28/02/2017		28/02/2017		Sí	0.8
55	EJECUCIÓN: Convenio Interinstitucional con CABLEVISIÓN renovado	5-Entregables Intermedios	31/03/2017		31/03/2017		Sí	0.8
56	EJECUCIÓN: Convenio Interinstitucional con ECTV ratificado	5-Entregables Intermedios	31/03/2017		31/03/2017		Sí	0.8
57	EJECUCIÓN: Informe firmado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de marzo	5-Entregables Intermedios	31/03/2017		31/03/2017		Sí	0.8
58	EJECUCIÓN: Informe firmado de cumplimiento de metas del proyecto	5-Entregables Intermedios	28/04/2017		28/04/2017		Sí	1.6
59	EJECUCIÓN: Informe firmado de mantenimiento preventivo de la Unidad Móvil y Grupo electrógeno I Cuatrimestre	5-Entregables Intermedios	28/04/2017		28/04/2017		Sí	0.8
60	EJECUCIÓN: Informe firmado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de abril	5-Entregables Intermedios	28/04/2017		28/04/2017		Sí	0.8
61	EJECUCIÓN: Informe firmado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de mayo	5-Entregables Intermedios	31/05/2017		31/05/2017		Sí	0.8
62	EJECUCIÓN: Informe firmado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de junio	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		30/06/2017		Sí	0.8
63	EJECUCIÓN: Informe firmado de instalación de repetidoras y cobertura para el proyecto I semestre	5-Entregables Intermedios	31/07/2017		31/07/2017		Sí	0.8
64	EJECUCIÓN: Informe firmado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de julio	5-Entregables Intermedios	31/07/2017		31/07/2017		Sí	0.8
65	EJECUCIÓN: Informe firmado cuatrimestral de cumplimiento de metas del proyecto	5-Entregables Intermedios	31/08/2017		31/08/2017		Sí	1.6
66	EJECUCIÓN: Informe firmado de mantenimiento preventivo	5-Entregables Intermedios	31/08/2017		31/08/2017		Sí	0.8

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de la Unidad Móvil y Grupo electrógeno II Cuatrimestre							
67	EJECUCIÓN: Informe firmado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de septiembre	5-Entregables Intermedios	29/09/2017		29/09/2017		Sí	0.8
68	EJECUCIÓN: Informe firmado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de octubre	5-Entregables Intermedios	31/10/2017		31/10/2017		Sí	0.8
69	EJECUCIÓN: Informe firmado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de noviembre	5-Entregables Intermedios	30/11/2017		30/11/2017		Sí	0.8
70	EJECUCIÓN: Informe firmado cuatrimestral de cumplimiento de metas del proyecto	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		29/12/2017		Sí	1.6
71	EJECUCIÓN: Informe firmado de instalación de repetidoras y cobertura para el proyecto II semestre	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		29/12/2017		Sí	0.8
72	EJECUCIÓN: Informe firmado de mantenimiento preventivo de la Unidad Móvil y Grupo electrógeno III Cuatrimestre	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		29/12/2017		Sí	0.8
73	EJECUCIÓN: Informe elaborado de transmisiones de actividades de la Función Ejecutiva en el mes de enero	5-Entregables Intermedios	30/01/2018		30/01/2018		Sí	0.41
74	EJECUCIÓN: Presupuesto aprobado para el proyecto en el año 2018	4-Inicio de Trabajo	30/01/2018		30/01/2018		Sí	1.86
75	EJECUCIÓN: Informe elaborado de transmisiones de actividades de la Función Ejecutiva en el mes de febrero	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		28/02/2018		Sí	1.34
76	EJECUCIÓN: Informe elaborado de transmisiones de actividades de la Función Ejecutiva en el mes de marzo	5-Entregables Intermedios	30/03/2018		30/03/2018		Sí	1.75
77	EJECUCIÓN: Informe elaborado de cumplimiento de metas del proyecto	5-Entregables Intermedios	30/04/2018		30/04/2018		Sí	1.03
78	EJECUCIÓN: Informe elaborado de mantenimiento preventivo de equipo electrónico de la Unidad Móvil y Grupo electrógeno I Cuatrimestre	5-Entregables Intermedios	30/04/2018		30/04/2018		Sí	1.03
79	EJECUCIÓN: Informe elaborado de transmisiones de TELECIUDADANA en el mes de abril	5-Entregables Intermedios	30/04/2018		30/04/2018		Sí	0.41
80	EJECUCIÓN: Informe elaborado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de mayo	5-Entregables Intermedios	31/05/2018		31/05/2018		Sí	0.41

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
81	EJECUCIÓN: Informe elaborado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de junio	5-Entregables Intermedios	29/06/2018		29/06/2018		Sí	1.03
82	EJECUCIÓN: Informe elaborado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de julio	5-Entregables Intermedios	31/07/2018		31/07/2018		Sí	1.44
83	EJECUCIÓN: Informe elaborado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de agosto	5-Entregables Intermedios	31/08/2018		31/08/2018		Sí	0.92
84	Informe elaborado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de septiembre	5-Entregables Intermedios	28/09/2018		28/09/2018		Sí	0.92
85	EJECUCIÓN: Informe elaborado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de octubre	5-Entregables Intermedios	31/10/2018		31/10/2018		Sí	0.92
86	EJECUCIÓN: Informe elaborado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de noviembre	5-Entregables Intermedios	30/11/2018	30/11/2018			No	0.92
87	EJECUCIÓN: Contratación realizada del servicio de streaming corporativo para TELECIUDADANA por un período de 305 días	5-Entregables Intermedios	28/12/2018	28/12/2018			No	0.64
88	EJECUCIÓN: Informe elaborado cuatrimestral de cumplimiento de metas del proyecto	5-Entregables Intermedios	28/12/2018	28/12/2018			No	1.03
89	EJECUCIÓN: Informe elaborado de instalación de repetidoras y cobertura para el proyecto II semestre	5-Entregables Intermedios	28/12/2018	28/12/2018			No	1.05
90	EJECUCIÓN: Informe elaborado de mantenimiento preventivo de equipo electrónico de la Unidad Móvil y Grupo electrógeno III Cuatrimestre	5-Entregables Intermedios	28/12/2018	28/12/2018			No	1.03
91	EJECUCIÓN: Convenio Interinstitucional firmado	5-Entregables Intermedios	31/12/2018	31/12/2018			No	1.86

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de repetidoras instaladas y operativas.		45.35 %	0.98	0.4444	01/01/2018	Ene-Jun
2	Porcentaje de convenios suscritos.		-	-	-	01/01/2018	-

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
3	Porcentaje de mantenimientos realizados a la unidad móvil.		101.02 %	0.66	0.6667	01/01/2018	May-Ago


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	925,587.20
Estimado Al Fin Del Proyecto:	6,725,587.78 **
Costo Total:	8,246,360.74
Total Devengado:	6,035,557.37
% Costo Total Devengado:	73.19 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 73.19 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	7,571,489.05	2,337,523.98	0.00	9,909,013.03
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	8,226,640.40	1,333,492.70	0.00	9,560,133.10
Ppto. Codificado	6,132,876.76	470,644.34	0.00	6,603,521.10
Ppto. Comprometido	5,886,145.44	198,402.86	0.00	6,084,548.30
Planeado - Codificado (2018)		1,866,879.64		
Programado a Devengar	7,489,079.55	888,433.27	0.00	8,377,512.82
Ppto. Devengado	5,837,154.51	198,402.86	0.00	6,035,557.37
Pagado Real	3,693,489.51	193,223.27	0.00	3,886,712.78
Estimado a fin de año	* 5,837,154.51	804,250.00	0.00	6,641,404.51
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	1,651,925.04	84,183.27	0.00	1,736,108.31
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 77.94 %	22.33 %	0.00 %	72.04 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018

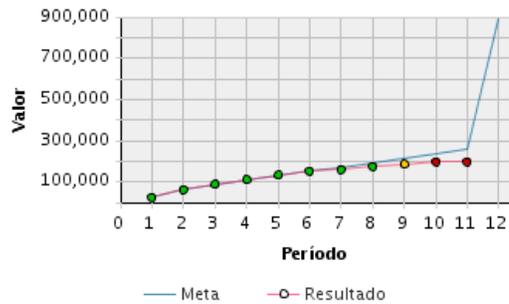

Presupuesto Mensual 2018

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	24,802.40	24,802.40	24,802.40	24,802.40	100.00 %	●	2.79 %

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	35,684.45	35,684.45	60,486.85	60,486.85	100.00 %		6.81 %
Mar	27,310.89	27,310.89	87,797.74	87,797.74	100.00 %		9.88 %
Abr	24,251.21	24,251.21	112,048.95	112,048.95	100.00 %		12.61 %
May	19,354.79	19,354.79	131,403.74	131,403.74	100.00 %		14.79 %
Jun	19,162.89	19,162.89	150,566.63	150,566.63	100.00 %		16.95 %
Jul	20,922.96	10,302.43	171,489.59	160,869.06	93.81 %		18.11 %
Ago	20,922.96	14,398.13	192,412.55	175,267.19	91.09 %		19.73 %
Sep	20,922.96	9,717.78	213,335.51	184,984.97	86.71 %		20.82 %
Oct	20,922.96	13,140.89	234,258.47	198,125.86	84.58 %		22.30 %
Nov	20,922.96	277.00	255,181.43	198,402.86	77.75 %		22.33 %
Dic	633,251.84		888,433.27				
Total	888,433.27	198,402.86					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

6	Incrementar la audiencia de los mensajes y productos comunicacionales que se difunden de las actividades del Gobierno MEDIANTE la innovación permanente de contenidos y mecanismos de difusión.
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Cedula presupuestaria Diciembre 2014	Cedula_presupuestaria_Diciembre_2014.pdf	05/01/2015
2	Cedula presupuestaria Febrero 2015	Cedula_presupuestaria_Febrero_de_2015.pdf	04/03/2015
3	Cedula presupuestaria noviembre	Cedula_Presupuestaria_Noviembre.pdf	03/12/2014
4	EJECUCION: Informe elaborado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de julio	Radio-Streaming-Unidad_Movil_-_David_Chavez.pdf	06/08/2018
5	Hito - 14 Solicitud de autorización de frecuencias definitiva ingresada a la autoridad de telecomunicaciones	Solicitud__Sostenibilidad_Económica_y_Plan_Comunicacional.pdf	04/02/2015
6	Hito - 14.1 Solicitud de autorización de frecuencias definitiva ingresada a la autoridad de telecomunicaciones	Estudio_de_ingenieria.pdf	04/02/2015
7	Hito - 15 Informe firmado de requerimiento de transferencia de fondos por convenio ECTV para el año 2015.	INFORME_NO_04-2015_Informe_de_convenio_ECTV.pdf	04/02/2015
8	Hito - 16 Informe firmado con TDRs para consultoría de diseño físico y arquitectónico de estudios.	TDR_consultoria_arquitectónica_CTV_final.pdf	04/02/2015
9	HITO - 69 Informe firmado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de noviembre	Informe_No._41_Informe_de_Operación_Noviembre.pdf	01/12/2017
10	HITO 10 - Informe firmado de requerimiento de espacio físico para instalación de estudios, control master, control técnico y estación terrena.	Requerimiento_de_espacios_fisicos_CTV.pdf	05/01/2015
11	Hito 11 - Informe firmado de avance de instalación de las 5 repetidoras y cobertura sistemas AVS	Informe_Cobertura_y_Cables_Diciembre_2014.pdf	05/01/2015
12	Hito 11.1 - Informe firmado de avance de instalación de las 5 repetidoras y cobertura sistemas AVS	Informe_de_avance_de_instalación_de_las_5_repetidoras.pdf	05/06/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
13	HITO 12 - Informe firmado de requerimiento de alquiler del control master para el año 2015	Requerimiento_alquiler_de_control_máster_2015.pdf	05/01/2015
14	HITO 13 - Plan Comunicacional elaborado para la autorización definitiva de frecuencias	PLAN_COMUNICACIONAL_05-01-2015.pdf	05/01/2015
15	Hito 17 Informe firmado con TDRs para consultoría de diseño físico y arquitectónico de estudios	TDR_consultoria_arquitectónica_CTV_final.pdf	04/03/2015
16	Hito 18 - Informe final firmado de instalación de 5 repetidoras	INFORME_No_2015-02_Instalación_5_repetidoras.pdf	04/03/2015
17	Hito 19 Contrato firmado de alquiler del control Master	INFORME_No_2015-03_Status_alquiler_CABLEVISION.pdf	04/03/2015
18	Hito 2 - Hito 3. Informe firmado de operación de repetidoras y sistemas de AVS a nivel nacional	Informe_cobertura_señal_abierta_y_SAVS.pdf	04/11/2014
19	Hito 20 - Acta de entrega recepción firmada, de consultoría para diseño físico y arquitectónico de estudios.	INFORME_No_2015-04_Informe_Actas_Consultoria_diseños_0204/2015	02/04/2015
20	Hito 21 - Informe firmado de avance de obtención de frecuencias definitivas para El ciudadano TV	INFORME_No_2015-05_Estado_de_solicitud_definitiva_de_frecuencias_definitivas.pdf	02/04/2015
21	HITO 22 - Informe firmado con TDRs para adecuación de espacios físicos y arquitectónicos.	INFORME_No_2015-05_Informe_TDRs_para_las_adequaciones_físicas_y_arquitectónicas_de_El_Ciudadano_TV.pdf	04/05/2015
22	Hito 23 - Resolución de autorización definitiva de frecuencias emitida por la autoridad de telecomunicaciones	INFORME_No_2015-07_Informe_de_autorización_de_frecuencias_definitivas.pdf	04/05/2015
23	HITO 24 Informe firmado de avance de los procesos de adquisición del equipamiento para estudios, control master, estación terrena y MAM	INFORME_No_2015-08_Informe_PROCESOS_ADQUISICIÓN_DE_EQUIPAMIENTO.pdf	03/06/2015
24	HITO 25 - Informe firmado de avance del proceso de contratación de adecuaciones físicas y arquitectónicas de los estudios	INFORME_No_2015-09_Informe_de_avance_del_proceso_de_contratación_de_adequaciones_físicas_y_arquitectónicas_de_los_estudios.pdf	03/06/2015
25	Hito 26 - Informe firmado con TDRs para adquisición de sistemas de transmisión para TDT	Términos_de_referencia_STREAMING.pdf	04/07/2015
26	Hito 27 - Informe firmado del avance del proceso de adquisición de equipamiento para Streaming del Canal	INFORME_No_2015-12_Avance_de_adquisición_de_sistema_de_streaming.pdf	05/08/2015
27	Hito 28: Informe firmado de TDRs para la adquisición de: SISTEMA PORTÁTIL DE PRODUCCIÓN DE EXTERIORES SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEÑALES DE AUDIO Y VIDEO PROFESIONAL PTP SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AUDIO Y VIDEO PROFESIONAL OFFLINE PARA EL CIUDADANO TV	Informe_agosto.pdf	03/09/2015
28	Hito 29 - Informe de TDRs para la CONTRATACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CÁPSULAS INFORMATIVAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA EL CIUDADANO TV	INFORME-TDRS.pdf	05/10/2015
29	Hito 30 - Informe firmado de avance del proceso de adquisición de equipamiento para los SISTEMAS PORTÁTIL DE PRODUCCIÓN DE EXTERIORES, TRANSMISIÓN DE SEÑALES DE AUDIO Y VIDEO PROFESIONAL PTP Y DE ALMACENAMIENTO DE AUDIO Y VIDEO PROFESIONAL OFFLINE	Informe_firmado_de_avance_del_proceso_de_adquisición_de equipamiento.pdf	05/11/2015
30	Hito 31 - Informe firmado de avance del proceso de adquisición de equipamiento para la CONTRATACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CÁPSULAS INFORMATIVAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA EL CIUDADANO TV	INFORME_No_2015-19_Contratación_de_pastillas.pdf	04/12/2015
31	HITO 32 - Acta de entrega recepción firmada del alquiler del control master	Informe_Acta_Alquiler_Master.pdf	04/01/2016
32	Hito 33 - Actas de entrega recepción firmada de CONTRATACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CÁPSULAS INFORMATIVAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA EL CIUDADANO TV	Informe_Acta_Pastillas_Turísticas.pdf	04/01/2016
33	Hito 34 - Actas de entrega recepción firmada de CONTROL MASTER DE STREAMING PARA MÚLTIPLES SEÑALES SD/HD SISTEMA PORTÁTIL	Informe_Acta_Master_Streaming.pdf	04/01/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	DE PRODUCCIÓN DE EXTERIORES Y SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE SEÑALES DE AUDIO Y VIDEO PROFESIONAL PTP		
34	Hito 35 - Informes final firmado de la implementación del proyecto "El Ciudadano TV"	Informe__final_2015_ejecución_del_proyecto.pdf	04/01/2016
35	HITO 36 - Informe de Planificación 2016	Informe_Planificación_2016_CTV.pdf	15/03/2016
36	Hito 37 - TDR's de Alquiler equipos del control Master	Informe_Febrero_TDR_Alquiler.pdf	15/03/2016
37	Hito 38 - Producción de pastillas informativas para el canal contratadas	INFORME_No_2016-03_Informe_de_Contratación_de_pastillas_informativas.pdf	04/04/2016
38	HITO 39 - Borrador de Convenio con Ecuador TV elaborado	INFORME_No_2016-04_Informe_de_Ejecución_de_Convenio con Ecuador TV.pdf	04/07/2016
39	Hito 4. Contrato suscrito para la adquisición de programación con contenidos nacionales	Contrato_de_Programación.pdf	04/11/2014
40	HITO 4.1 - Contrato de adquisición de programación con contenidos nacionales	Contrato_de_adquisición_de_programación_con_contenidos_nacionales.pdf	05/06/2015
41	hito 40 - TDR's de streaming elaborado	INFORME_No_2016-05_Informe_de_elaboración_de_TDRs de streaming.pdf	04/04/2016
42	Hito 41 - Convenio con Ecuador TV aprobado y firmado	INFORME_No_2016-06_Informe_de_Ejecución_de_Convenio con Ecuador TV.pdf	07/07/2016
43	Hito 42 - Servicio de streaming contratado	INFORME_No_2016-07_Informe_de_elaboración_de_Servicio de streaming.pdf	03/05/2016
44	Hito 43 - Informe de Operación de canal mayo	INFORME_No_2016-10_Operación_Mayo.pdf	03/06/2016
45	HITO 44 - Informe de Operación de canal junio	INFORME_No_2016-11_Operación_Junio.pdf	01/07/2016
46	HITO 45 - Informe de Operación de canal del mes de julio	INFORME_No_2016-12_Operación_Julio.pdf	02/08/2016
47	HITO 46 - Informe de Operación de canal agosto	Informe_de_cumplimiento_mensual_GPR_agosto_2016.pdf	02/09/2016
48	Hito 47 - Informe de Operación de canal septiembre	Informe_de_Operación_de_canal_septiembre.pdf	03/10/2016
49	HITO 48 - Informe de Operación de canal octubre	INFORME_DE_OPERACIÓN_CANAL_OCTUBRE_2016-1.pdf	01/11/2016
50	HITO 49 - Informe de Operación de canal noviembre	Informe_de_operaciones_de_noviembre.pdf	02/12/2016
51	Hito 5 - Convenio para retransmisión con la operadora DirecTV	Convenio_para_retransmisión_con_la_operadora_DirecTV.pdf	03/12/2014
52	HITO 50 - Informe anual del proyecto Canal El Ciudadano TV	Informe_anual_2016.pdf	03/01/2017
53	HITO 51 - Presupuesto aprobado para el proyecto en el año 2017	Informe_de_uso_04_Informe_de_Presupuesto_Aprobado.pdf	03/02/2017
54	HITO 52 - Informe firmado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de enero	Informe_No._05_Informe_de_Operación_enero.pdf	03/02/2017
55	HITO 53 - Contratación firmada del servicio de streaming corporativo para TELECIUDADANA	Informe_No._8_CONTRATACIÓN_STREAMING.pdf	02/03/2017
56	HITO 54 - Informe firmado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de febrero	Informe_No._05_Informe_de_Operación_febrero.pdf	02/03/2017
57	HITO 55 - Convenio Interinstitucional con CABLEVISIÓN renovado	Informe_No._13_INFORME_DE_CONVENIO_CABLEVISIÓN GPR.pdf	03/03/2017
58	hito 56 - Convenio Interinstitucional con ECTV ratificado	Informe_No._14_INFORME_DE_CONVENIO_ECTV_GPR.pdf	03/04/2017
59	HITO 57 - Informe firmado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de marzo	Informe_No._15_Informe_Tx_Estudios_y_Móvil_Marzo.pdf	03/04/2017
60	HITO 58 - Informe firmado de cumplimiento de metas del proyecto	Informe_de_cumplimiento_de_meas_del_proyecto.pdf	02/05/2017
61	HITO 59 - Informe firmado de mantenimiento preventivo de la Unidad Móvil y Grupo electrógeno I Cuatrimestre	Informe_de_mantenimiento_Unidad_Móvil.pdf	02/05/2017
62	Hito 6 - (1) Convenio de pago firmado por elaboración de estudios de ingeniería de frecuencias	Convenio_de_pago_firmado_por_elaboración_de_estudios_de_ingeniería_de_frecuencias.pdf	03/11/2014
63	Hito 6 - (2) Convenio de pago firmado por elaboración de estudios de ingeniería de frecuencias	Cur_de_pago_del_convenio_firmado_por_elaboración_de_estudios_de_ingeniería_de_frecuencias.pdf	03/11/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
64	HITO 60 - Informe firmado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de abril	Informe_de_transmisiones_de_estudios_y_unidad_móvil.pdf	02/05/2017
65	HITO 61 - Informe firmado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de mayo	Informe_de_transmisión_de_estudios_y_unidad_móvil.pdf	02/06/2017
66	Hito 62 - Informe firmado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de junio	Informe_No._28_Operación_TELECIUDADANA_Junio.pdf	03/07/2017
67	HITO 63 - Informe firmado de instalación de repetidoras y cobertura para el proyecto I semestre	Informe_No._30_Informe_de_Coberturas_de_TELECIUDADANA_I_Semestre.pdf	02/08/2017
68	HITO 64 - Informe firmado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de julio	Informe_No._29_Informe_de_Operación_Julio.pdf	02/08/2017
69	HITO 65 - Informe firmado cuatrimestral de cumplimiento de metas del proyecto	Informe_No._35_Cumplimiento_de_metas_CTV_II_Cuatrimestre.pdf	01/09/2017
70	HITO 66 - Informe firmado de mantenimiento preventivo de la Unidad Móvil y Grupo electrógeno II Cuatrimestre	Informe_No._34_Informe_de_Mantenimiento_de_la_Unidad_Móvil_y_Grupo_electrógeno_II_Cuatrimestre.pdf	06/09/2017
71	HITO 67 - Informe firmado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de septiembre	Informe_de_Operación_septiembre_CTV.pdf	02/10/2017
72	HITO 68 - Informe firmado de transmisiones mediante unidad móvil y desde estudios de TELECIUDADANA en el mes de octubre	Informe_No._39_Informe_de_Operación_Octubre.pdf	01/11/2017
73	Hito 7 - Estudio Financiero elaborado para autorización definitiva	Formulario-Sostenibilidad-Economica-Publico.xls	03/12/2014
74	Hito 8 - Informe firmado con TDRs para adquisición estación terrena, MAM, Control Master, Equipamiento estudios	Informe_firmado_con_TDRs_para_adquisición_estación_terrena_MAM_Control_Master_Equipamiento_estudios.pdf	02/12/2014
75	Hito 81 - Informe de El Ciudadano TV - 2018 Junio	Informe_de_El_Ciudadano_TV_-_2018_Junio.pdf	04/07/2018
76	Hito 82 - Transmisiones en vivo - 2018 julio	Radio-Streaming-Unidad_Movil_-_David_Chavez.pdf	06/09/2018
77	Hito 83 - Transmisiones en vivo - 2018 agosto	Transmisiones_en_vivio_-_David_Chávez.pdf	06/09/2018
78	Hito 9 - Adendum a convenio con ECTV firmado para instalación de 5 repetidoras adicionales	Adendum_a_convenio_con_ECTV_firmado_para_instalación_de_5_repetidoras_adicionales.pdf	05/05/2015
79	Hito-1. Solicitud firmada de convenio de pago por estudios de ingeniería de frecuencias	Solicitud_de_convenio_de_pago_estudio_de_ingenieria.pdf	04/11/2014

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Arboleda Palma, Jorge Ricardo	Líder del Proyecto	Subsecretario de Medios Institucionales	jorge.arboleda@secom.gob.ec	
